



# Regio Deal Noordoost Brabant

## Tussenrapportage

Periode: juli 2020 - november 2021

Web versie - Definitief - 9 februari 2022



Rijksoverheid

Provincie Noord-Brabant





# Inhoudsopgave

---

1. Samenvatting	<a href="#"><u>4-5</u></a>
2. Resultaten en voortgang op de 17 projecten	<a href="#"><u>6-25</u></a>
2 a. Inhoudelijke voortgang	<a href="#"><u>9-13</u></a>
2 b. Financiële voortgang	<a href="#"><u>14-22</u></a>
2 c. Looptijd en planning	<a href="#"><u>23-25</u></a>
3. Brede Welvaart en effect	<a href="#"><u>26-32</u></a>
4. Programma organisatie, publiciteit en communicatie	<a href="#"><u>32-35</u></a>
5. Conclusies	<a href="#"><u>36-37</u></a>
Bijlage 1 De Regio Deal in een notendop	<a href="#"><u>38-42</u></a>
Bijlage 2 Stand van zaken per project	<a href="#"><u>43-67</u></a>



*Project: Circular Food Center - Innovatieprogramma circulaire verpakkingen met HAS-studenten en ondernemer*

# 1. Samenvatting



## Samenvatting

- Alle 17 Regio Deal projecten zijn in uitvoering en goed op stoom. Vertragingen komen door corona en/of krapte op de arbeidsmarkt.
- Alle projecten verwachten hun doelstellingen te gaan bereiken, maar groot aantal (11) hebben daar wel langere looptijd voor nodig dan in december 2020 bedacht.
- Twee subsidiestromen (Rijksdeel via kassier en Provincie) met andere kaders blijven voor projecten lastig en tijdrovend.
- Drie projecten (Leefbaarheid in de dorpen, Puzzelen met Ruimte en Datagedreven AgriFood Regio) vragen nog extra aandacht met name voor het financieel-administratief beheer.
- Trots zijn de partners in de regio op de Regio Deal. Er is zichtbaar meer versnelling op een integrale aanpak van de regionale opgaven en er is meer verbinding zowel op bestuurlijk, tactisch als uitvoerend niveau zowel binnen de regio als met Rijk en provincie.





*Bijeenkomst projectleiders Regio Deal en gemeentelijke accountmanagers bedrijven bij project SPARK Makers Zone*

## 2. Resultaten en voortgang op de 17 projecten

a: Inhoudelijke voortgang | b: Financiële voortgang | c: Looptijd en planning



## Resultaten 17 projecten

17 projecten in uitvoering 5 dorpsinitiatieven 18 gebiedsprocessen 9 community's: Circular Food Center, Keukenkanjers, Industry Fieldlab, Agro Proeftuin de Peel, Keep op Learning, AFI AgriFood Hightech, Driven bij Data, ZZP NOB Boost, Leefbaarheid in de dorpen 125 afstudeerstages 26 deelnemers techniekoriëntatie 1 handelingsperspectief internationale werknemers 200 innovaties voor bedrijfsleven 300 jongeren MBO challenges 19 businesscases 560 loopbaanadviezen 3 tools: dashboard vervoersbewegingen voorzieningen, vitaliteitsscan dorpshuizen, leefbaarheids-monitor 200 gebruikers SPARK Makers zone 22 pilots voor nieuw product, dienst of centrum 50 filmpjes 'Talent uit' 18 kennissessies 2 systeemspongen: Slimme varkensketen en digitale gewasketen

## Stoplichtmonitor Regio Dealprojecten 2020-2023/2024

Versie 13 januari 2022

### Rapportages

Regio Deal projecten	Begroting	Rijksbijdrage	2		3	
	Startdatum	Einddatum	jul20-mei21	jul20-nov21		
<b>Project 1: Leefbaarheid in de dorpen</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	4.793.000	1.000.000				
looptijd en planning	1-10-2020	31-12-2022*				
<b>Project 2: Transformatie centra steden</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	200.000	75.000				
looptijd en planning	1-7-2021	31-12-2023				
<b>Project 3: Voorzieningen voor internationale werknemers</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	200.000	0				
looptijd en planning	1-9-2020	31-8-2022*				
<b>Project 4: Inzet data voor vitale voorzieningen</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	60.000	0				
looptijd en planning	1-9-2020	31-12-2024				
<b>Project 5: Voedseleducatie</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	450.000	150.000				
looptijd en planning	1-9-2020	31-12-2023				
<b>Project 6: Klaar voor de banen van nu en de toekomst</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	3.650.000	1.000.000				
looptijd en planning	10-7-2020	31-12-2023				
<b>Project 7: SPARK Makers zone</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	545.000	200.000				
looptijd en planning	1-9-2020	30-9-2023				
<b>Project 8: Nieuwe perspectieven voor boeren</b>						
inhoudelijke voortgang						
financiële voortgang	180.000	130.000				
looptijd en planning	1-9-2020	1-4-2023				



### Project 9: Puzzelen met ruimte in het buitengebied

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	4.250.000	1.650.000		
looptijd en planning	1-1-2021	31-12-2023*		



### Project 10: Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	2.600.000	1.300.000		
looptijd en planning	1-9-2020	31-12-2024		



### Project 11: AgroProeftuin De Peel

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	3.040.000	1.000.000		
looptijd en planning	10-7-2020	31-12-2024		



### Project 12: AgriFood Innovation

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	11.770.000	1.350.000		
looptijd en planning	10-7-2020	10-7-2023*		



### Project 13: ODE

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	400.000	100.000		
looptijd en planning	1-10-2020	31-12-2022		



### Project 14: Circular Food Center

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	4.850.000	870.000		
looptijd en planning	1-10-2020	31-12-2023		



### Project 15: Greentech Park Brabant

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	250.000	100.000		
looptijd en planning	1-8-2020	1-3-2023		



### Project 16: Direct energie uit mest

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	355.000	75.000		
looptijd en planning	10-7-2020	31-12-2024		



### Project 17: Datagedreven Agrifoodregio

inhoudelijke voortgang				
financiële voortgang	2.062.531	700.000		
looptijd en planning	1-7-2020	31-12-2022*		

\* Verwachte uitloop van einddatum





*Project: AgriFood Innovation - Slimme Varkensketen*

## 2 a: Inhoudelijke voortgang





## Inhoudelijke voortgang

- Vier projecten op **oranje**, overige op groen. Een project scoort oranje als er op meerdere beoogde resultaten lager wordt gescoord.
- Twee projecten doen het beter vergeleken met vorig meetmoment
  - Transformatie centra steden (project 2) (van rood naar oranje)
  - Nieuwe perspectieven voor boeren (project 8) (van oranje naar groen)
- Eén project doet het minder goed vergeleken met vorig meetmoment
  - Puzzelen met Ruimte (project 9) (van groen naar oranje)



# Drie redenen score **oranje**

## 1) Corona

- Niet kunnen starten van de activiteit (Voedseleducatie: project 5).
- Overige projecten hebben afgelopen half jaar niet heel veel hinder van corona ondervonden. Er is meer geanticipeerd op en ervaring met de situatie.

## 2) Krapte op de arbeidsmarkt

- Puzzelen met ruimte (project 9). Te weinig personeel voor gebiedsindeling. Er komt wijzigingsvoorstel om Rijksmiddelen o.a. in te zetten voor personeel voor de gebieden. Dit was oorspronkelijk niet voorzien. Ook project Stallenaanpak (project 10) signaleert veel wijzigingen en capaciteitsproblemen bij gemeenten, maar in deze fase ondervinden ze nog geen hinder.
- Datagedreven AgriFoodregio (project 17) geeft aan dat het lastig is om aan geschikt personeel te komen voor uitvoering project.

## 3) Vertraging opstart

- Transformatie centra steden (project 2) definitief gestart in september. Project heeft daarom nog weinig inhoudelijke voortgang kunnen laten zien.



## Doorkijk inhoudelijke voortgang

- Alle 17 projecten geven aan doelstelling te gaan realiseren.
- Alle 17 projecten hebben duidelijk beeld van de voorgenomen activiteiten voor het komende half jaar.

### **Gemeentelijke herindeling/ verkiezingen**

- Twee projecten geven aan dat er zorgen zijn om toekomstige 'bestuurlijke trekkracht' en/of ambtelijke capaciteit door herindeling/verkiezingen:
  - Voorzieningen voor internationale werknemers (project 3)
  - Puzzelen met ruimte (project 9)



## Aandachtspunten inhoudelijke voortgang

Onderwerpen die genoemd zijn om over uit te wisselen:

- Circulaire economie;
- Bewonersparticipatie.

Input voor het Rijk:

- Voedselverspilling hoger op klimaatagenda, nu versnipperd over verschillende departementen.
- Maak gebruik Bokashi (bodemverbeteraar) mogelijk vanuit één overheid, nu versnipperd over verschillende departementen.
- Maak gebruik van integrale gebiedsprocessen, gebruik ervaringen van Provincie en Regio bijvoorbeeld vanuit Puzzelen met Ruimte.
- Verkennen van de mogelijkheden voor een landelijk Migratie informatiepunt.





*Marc Hameleers, manager regio portefeuille bij Ministerie LNV op de Regio-heidag*

## 2 b: Financiële voortgang



## Financiële voortgang

- Alle 17 projecten hebben over financiële realisatie t.o.v. planning gerapporteerd over Rijksdeel, bijdrage gemeenten/waterschappen, bijdrage provincie en overige financiering.
- Deze vier 'scores' hebben geleid tot een totaal score die bepalend is of kassier overgaat tot uitbetaling van volgende voorschot Rijksdeel conform financiële planning uit nulmeting.
- Zes projecten staan op **rood** en ontvangen daarom geen derde voorschot.
  - Met Leefbaarheid in de dorpen (project 1) wordt nog gesprek gevoerd
- Vier projecten staan op **oranje**.
  - Aan AFI (project 12) wordt geen derde voorschot uitbetaald. Derde voorschot wordt afhankelijk volgende meting samengevoegd met vierde voorschot.



## Financiële voortgang (2)

### Redenen **rood/ oranje**:

- Laat of nog niet beschikbaar provinciale middelen, terwijl daar in financiële uitgave planning wel rekening mee was gehouden.
- Bedrijf (leadpartner AFI (project 12)) heeft lening bij provincie nog niet aangevraagd.
- Gemeentelijke middelen zijn nog niet beschikbaar gesteld, terwijl daar in financiële uitgaven planning wel rekening mee was gehouden.
- Vertraging op verkrijgen overige financiering: de toezegging op in kind bijdragen voor Nieuwe perspectieven voor boeren (project 8) van de provincie was lang onduidelijk. Het wordt nu een financiële bijdrage.
- Later starten project en/of vertraging corona en daarmee vertraging in uitgaven.



## Doorkijk financiële voortgang (1)

- Meeste projecten die financieel achterblijven (rood en oranje), gaan of hebben hun looptijd aangepast en geven aan begroting te gaan realiseren.
- Projecten die mogelijk financieel onder realiseren op Rijksdeel.  
Volgende rapportagemoment moet meer duidelijkheid hierover geven:
  - Leefbaarheid in de dorpen (project 1)
  - Voedseleducatie (project 5)
  - Puzzelen met ruimte (project 9)
- Project die aangaf meer middelen nodig te hebben:
  - Nieuwe perspectieven voor boeren (project 8)





## Doorkijk financiële voortgang (2)

- Verhouding 1:1 Rijksdeel en overige publieke co-financiëring ziet er goed uit.
- Provinciale beschikkingen moeten nog komen voor Transformatie Centra steden (project 2) en Datagedreven AgriFoodregio (project 17)
- Projecten hebben bijdragen van gemeenten/ waterschappen bijna allemaal op orde. Voor projecten Leefbaarheid in de dorpen (project 1) en Puzzelen met ruimte (project 9) worden extra overleggen gepland om dit te monitoren. Project Stallenaanpak (project 10) moet raadsbesluiten nog aanleveren.
- Er was nog geen formeel besluit op inzet van de regionale bijdrage. Dat blijkt nodig als co-financieringsverklaring. Het DB+ stelt daarom in februari 2022 de regionale bijdrage definitief vast voor de projecten Voorzieningen voor internationale werknemers (project 3), Voedseleducatie (project 5), Klaar voor de banen van nu en de toekomst (project 6) en AgroProeftuin de Peel (project 11)



## Doorkijk financiële voortgang (3)

- Door de kassier wordt niet strak gemonitord op overige financiering (is geen onderdeel van SiSa). Door de provincie wordt bij de eindafrekening deze overige financiering wel beoordeeld. Er zijn dus 2 'afrekenmethoden'. In overleg met provincie wordt bekeken of en hoe provincie kan omgaan met overige financiering en de bijbehorende naar de rato bepaling.



## Financiële bijvangst (mei 2021 - november 2021)

- Twee projecten doen mee aan REACT EU van gemeente 's-Hertogenbosch en Meierijstad:
  - SPARK Makers Zone (project 7) en Circular Food Center (project 14)
- Extra middelen beschikbaar gesteld door provincie voor projectplan 'Samen de handen uit de mouwen':
  - Dit project is onderdeel van Stallenaanpak (project 10).
- Participatie in RIF aanvraag 'Impact van data' door ROC de Leijgraaf:
  - Inzet data voor vitale voorzieningen (project 4).
- IBP Verbonden proeftuinen voor slimme rotatieteelt:
  - AgroProeftuin de Peel (project 11).
- Aanvraag stimuleringsfonds circulaire innovatie:
  - GreentechPark Brabant (project 15).



## Overige financiële zaken: kassier

- Alle projecten hebben voorafgaand, als extra voorbereiding op het voortgangsgesprek, een mail ontvangen van de kassier over projectstructuur, penvoerderschap, co-financieringsverklaringen, SiSa verantwoording 2020, BTW compensatie en herziene beschikking.
- BTW compensatie
  - Opgave is tijdig ingediend bij Ministerie LNV.
  - Tweede, laatste termijn is uitbetaald aan kassier. Het totaal ontvangen voorschot bedraagt € 9.744.008,-.
- SiSa
  - SiSa 2020 is door de meeste projecten niet op deadline (1 september 2021) aangeleverd. Extra acties zijn uitgezet om ontbrekende informatie te verkrijgen.
  - Projectleiders ontvangen voor SiSa 2021 instructiemail van de kassier zodat in 2022 overzichten tijdig binnen zijn.
- Herziene beschikkingen
  - Kassier gaat alle beschikkingen herzien op basis van nieuwe informatie, o.a. BTW compensatie, nieuwe Regio Deal begroting, aangepaste uitbetaaltermijnen n.a.v. verschuiving van de looptijd.





## Leerpunten voor volgend programma

- Indien er sprake is van twee subsidiestromen, deze aan de voorkant zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en afspraken intern regelen en borgen o.a. op verantwoordingssystematiek en planning.
- Voldoende tijd en kennis over het programma dient er beschikbaar te zijn om aanvragen inhoudelijk te beoordelen en beschikkingen tijdig af te geven.
- Duidelijke afspraken maken en vastleggen op programma- en projectniveau over wanneer en hoe van herschikken van middelen.
- De instructies/ spelregels voor monitoring en verantwoording en deelname aan een subsidieprogramma dienen tijdig schriftelijk aan projecten kenbaar te worden gemaakt.
- Projecten dienen meer aandacht te hebben voor financieel-administratief beheer.
- Bij aanvang dient beter doorggevraagd te worden op uitgavenplanning. Deze lijken bij nulmeting niet altijd goed doordacht.



*Project: Leefbaarheid in de dorpen - werkbezoek Europarlementariër Tom Berendsen en gedeputeerde Ronnes*

## 2 c: Looptijd en planning



## Looptijd

Een project scoort **oranje** als tijdens het voortgangsgesprek bleek dat een langere looptijd nodig is. Zes projecten op **oranje**, overige op groen.

### Redenen oranje

- Uitvoering duurt langer dan voorzien en daarom moet looptijd worden verlengd:
  - Leefbaarheid in de dorpen (project 1);
  - Puzzelen met Ruimte (project 9);
  - AgriFood Innovation (project 12);
  - Data gedreven AgriFoodregio (project 17).
- Project is enkele maanden later gestart dan aanvankelijk aangevraagd, maar blijft op de aangegeven 2 jaar:
  - Voorzieningen voor internationale werknemers (project 3).
- Project is later gestart en looptijd bij aanvraag al aangepast:
  - Transformatie centra steden (project 2).



## Doorkijk en leerpunt looptijd

- Verlenging voor Rijksdeel is mogelijk binnen de afgegeven beschikkingen door de kassier. Alle projecten hebben 31 december 2024 als einddatum in hun beschikking.
- Projecten zijn erop geattendeerd dat bij provincie aanvraag verlenging formeel noodzakelijk is. AFI (project 12) heeft verzoek al ingediend.
- Met provincie vindt nog overleg plaats welke projecten looptijd ook kunnen verlengen tot 31 december 2024. Bij de statenmededeling is uitgegaan van einddatum 31 december 2023.

### **Leerpunt voor volgend programma**

- Kijk vooraf samen met de projecten kritisch naar de benodigde looptijd. Tijdens de voortgangsgesprekken in mei 2021 hadden vijf projecten hun looptijden al aangepast. In totaal dus 11 projecten die een langere looptijd hebben, dan in december 2020 voorzien.
- Trek looptijden, indien sprake is van verschillende subsidieverstrekkers, gelijk.





*Project: AgroProeftuin de Peel - Ben Brands, wethouder en bestuurlijke trekker neemt afscheid*

### 3: Brede Welvaart en effect

# CBS Monitor Brede Welvaart 2021: hier en nu

Thema	Indicator	Waarde	Ranking	Trend <sup>1</sup>	Thema	Indicator	Waarde	Ranking	Trend <sup>1</sup>
Welzijn	Tevreden met het leven	84,8%	28	-	Wonen	Tevreden met woonomgeving	87,7%	3	-
	Tevreden met vrije tijd	75,8%	32	+7		Tevreden met woning	87,3%	10	-
Materiële welvaart	Mediaan besteedbaar inkomen	€ 27.300	7	+2		Afstand tot sportterrein	0,9 km	6	-
	Bruto Binnenlands Product	€ 42.100	9	-		Afstand tot basisschool	0,7 km	12	-
Gezondheid	Overgewicht	49,6%	14	-		Afstand tot café e.d.	1,1 km	13	-3
	Levensverwachting per geslacht	Onbekend <sup>2</sup>			Samenleving	Contact familie, vrienden of buren	72,3%	4	-
	Levensverwachting bevolking	82 jaar	18			Vertrouwen in instituties	71,6%	9	-4
	Ervaren gezondheid	79,2%	20	+4		Vertrouwen in anderen	61,8%	24	-
	Langdurige zieken	31,6%	13	-5		Vrijwilligerswerk	47,1%	13	+3
Arbeid en vrije tijd	Netto arbeidsparticipatie	71,0%	2	+2	Veiligheid	4 indicatoren (zonder gegevens) <sup>2</sup>			
	Bruto arbeidsparticipatie	73,4%	2	+2	Milieu	Natuurgebied per 1000 inwoners	25 ha	21	-
	Hoogopgeleide bevolking	32,9%	12	+1		Emissies van fijnstof naar lucht	Onbekend <sup>2</sup>		
	Werkloosheid	3,3%	6	-2		Afstand tot openbaar groen	0,5 km	13	-
	Vacaturegraad	Onbekend <sup>2</sup>				Natuur en bosgebied	12%	22	-
	Tevredenheid reistijd wonen/werk	83,5%	29	+2		Broeikasgasemissies	9 ton	18	-5

Positie 1-10	Positie 11-20	Positie 21-30	Positie 31-40
--------------	---------------	---------------	---------------

<sup>1</sup> Trend weergeeft het relatieve verschil aan tussen de gegevens uit het CBS Dashboard 2021 in relatie tot het CBS Dashboard 2020.

<sup>2</sup> Het CBS levert op dit moment geen informatie over deze indicatoren. Dit wordt in de toekomst wel verwacht.





## Opvallende punten uit CBS monitor

- We doen het goed als regio (meer groen dan oranje/rood).
- Drie thema's: materiële welvaart, gezondheid en wonen scoren volledig in het groen. In heel Nederland is volgens het CBS (dec 2021) wonen momenteel het grootste pijnpunt, inclusief afstand tot de voorzieningen.
- We stijgen t.o.v. andere regio's op acht indicatoren en dalen op vijf indicatoren. Per saldo gaan we als regio er iets op vooruit.
- We scoren hoog op arbeidsparticipatie (positie 2 van 40).
- Slechts op één indicator 'tevredenheid vrije tijd' in onderste regionen (positie 32 van 40).

Deze monitor kan gebruikt worden om voor nieuwe regionale programma's afwegingen te maken waarop extra geïnvesteerd moet worden.



# Beoogde effecten per pijler voor Brede Welvaart

## Brede welvaart

Welbevinden, Leefomgeving, Kwaliteit natuur en milieu, Gezondheid, Vertrouwen in overheid, Economische groei

Goed Leven	Fijn Wonen	Anders Werken
Vergroten betrokkenheid burgers in lokale kernen bij leefomgeving	Verminderen milieuhinder en verbeteren luchtkwaliteit door kringlooplandbouw	Vermindering van nadelige effecten van landbouw en voedselverwerking op natuur en milieu
In stand houden voorzieningenniveau in centra steden en dorpen	Effectiever inzetten ruimte in landelijk gebied voor maatschappelijke doelen (natuur, klimaat/water, energie, transitie landbouw)	Stimuleren en versterken van duurzame, circulaire en/of innovatieve verdienmodellen voor bedrijven
Een goed werk- en toekomstperspectief voor inwoners en bedrijven	Tegengaan ondermijning op het platteland	Versterken duurzame inzetbaarheid door verbeteren digitale vaardigheden van de beroepsbevolking
Betere aansluiting vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt		



## Effecten door Regio Deal

- Nog te vroeg om effecten echt hard (kwantitatief) te maken. Daarbij worden de beoogde effecten ook door veel andere interventies beïnvloed.
- We doen de juiste dingen:
  - Corona en maatschappelijk onbehagen creëren urgentie om extra te investeren op 'goed leven in alle facetten' en het betrekken van inwoners.
  - Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om regionale oplossingen voor inwoners en bedrijven.
  - Integrale gebiedsaanpak 'Fijn Wonen' is noodzakelijk om invulling te geven aan de verschillende maatschappelijke opgaven. Interessante leerervaringen worden opgedaan die bruikbaar zijn voor uitvoering van nieuw kabinetsbeleid.
  - Thema voeding en gezondheid staat mede door corona hoger op de politieke agenda. Daarmee krijgen ook bewustwording en transitie naar een duurzaam systeem van landbouw en voedselverwerking een impuls: precies, circulair, waardevol en verbonden.
  - Veel projecten zetten jongeren in om resultaten te behalen. Dat is belangrijk. De toekomst begint immers bij de jeugd.



## Projectleiders over effecten en meedoen met de deal

- Effecten moeten leiden tot gewenste verandering. Een beweging die in gang wordt gezet. Projectleiders is gevraagd of ze beweging in de regio zien ontstaan en of het goede kant op gaat en wat voor meerwaarde ze zien om mee te doen met deze deal.
  - Nieuwe netwerken ontstaan waardoor kennisdeling makkelijker verloopt. Samenwerking loont.
  - Nieuwe aanpakken kunnen sneller en eenvoudiger worden uitgetest en gedeeld.
  - Kennis over regionale vraagstukken en betrokken organisaties is vergroot. Er is grotere onderlinge betrokkenheid. Er worden meer gesprekken met elkaar gevoerd.
  - Er is meer aandacht voor het betrekken van aanpalende beleidsvelden. Er wordt ingezien dat een integrale uiteindelijk tot groter en/of blijvender effect lijkt.



# Verbeter- en leerpunten realiseren en meten effecten

## Verbeter- en aandachtspunten komend half jaar

- Van tellen naar vertellen. Meer verhalen bij betrokkenen van de projecten ophalen zodat effect duidelijker zichtbaar wordt.
- Projecten en Rijk kunnen elkaars netwerk en kennis nog beter benutten.
- Uitwisseling van opgedane kennis en ervaringen tussen de projecten blijven stimuleren en faciliteren.
- Goede voorbeelden laten zien over positieve bijdrage van bewonersparticipatie.

## Leerpunten voor volgende programma

- Aan de voorkant meer aandacht voor wat zijn gewenste brede welvaartseffecten op korte en langere termijn
- Aan de voorkant meer aandacht voor de vraag waar heeft burger behoefte aan.
- Meer capaciteit en middelen voor monitoring van effecten beschikbaar hebben.





*Project: Circular Food Center - opening Verspillingsvrije week door Kees van Rooij en Toine Timmermans*

## 4. Programma organisatie, publiciteit en communicatie





## Programmaorganisatie (mei 2021 - november 2021)

### Vorbereiding besluitvorming DB+:

- Voortgangsrapportage juli 2020 - mei 2021 is goedgekeurd en tijdig ingediend (14 juli) bij en besproken met het Rijk (9 september).
- Regionale ambitie op circulaire economie is vastgesteld.

### Wijzigingen personele bezetting:

- Nieuwe programmasecretaris gestart.
- Nieuwe financieel adviseur en administrateur bij kassier.

### Lerende organisatie:

- Procesevaluatie gestart naar propositie, dealmaking, opstartfase van Regio Deal. Rapportage wordt in februari 2022 verwacht.



## Publiciteit en communicatie (mei 2021 - november 2021)

### Door programma organisatie

- Maandelijks update in nieuwsbrief RNOB
- Kansenskaart en bijeenkomst 'Extra Kansen voor ondernemers door Regio Deal' voor projectleiders en gemeenten (9 september)
- Bijeenkomst projectleiders Regio Deal (18 november)
- Voortgangsrapportage juli 2020 - mei 2021 is breed verspreid o.a. naar colleges, raden, AB- en DB Waterschappen, Gedeputeerde Staten, Stichtingsbestuur AFC en Strategieoverleg Noordooost Brabant Werkt

### Door projecten

- Eigen nieuwsbrieven/ website / LinkedIn/ Facebook (9 projecten)
- Bijeenkomsten
- Nieuws- en persberichten



## Aandachtspunten komend half jaar

- Projecten van rood/oranje weer laten stijgen zowel op inhoud als financiën:
  - Extra aandacht voor de projecten 1, 9 en 17.
  - Goede instructies en ondersteuning van projecten voor invullen SiSa 2021.
  - Overleg met provincie over looptijden en 'afrekenmethoden'
- Informeren en kennismaken nieuwe penvoerders/ projectleiders, raden, colleges en bestuurlijk trekkers over Regio Deal.
- Inhoudelijke projectleidersbijeenkomst delen van ervaringen op inzet van kennisinstellingen.
- Volgen ontwikkelingen effectmeting brede welvaart.
- Kansen verkennen vanuit nieuwe regeerakkoord en collegeprogramma's.
- Verbinden met andere Regio Deals.

Management

Janet Koozen

HAS Hogeschool pakt uit. Of in?

# Circulaire verpakkingen

HAS Hogeschool, het Zuid-Nederlandse opleidingsinstituut op het gebied van agro, food en leefomgeving, heeft in haar studieprogramma opleidingen en cursussen op het gebied van circulair verpakken. Maar ook onderzoek is een belangrijk deel van de activiteiten.

**A**ls in 2018 winkelde 66% van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar online en in de afgelopen periode is dat aantal stevig gestegen. En zij kopen steeds meer online waarmee ook de vraag naar verpakkingen toeneemt. Tegelijkertijd staat de verpakkingsector voor een grote uitdaging: het verduurzamen van verpakkingen. Maar wat is een duurzame verpakking?

Seifan Hermans, afstudeercoördinator Packaging & Design van de opleiding Food Innovation: "Allerlei instanties buigen zich over die vraag. Dat leidt tot andere vragen: hoe ziet de lifecycle analyse eruit, wat is het afvalgedrag, hoe zit het met recyclebaarheid, wat is de volumetrische efficiëntie enzovoort."

*"Als je dit allemaal aan 'verpakken' denkt, dan draait het om maar één ding."*

**Duurzame Verpakking.** 'Waarom in de gemeente Oss? Kijk maar eens in je koel- of bevroerkast en de kans is groot dat de helft van de verpakkingen uit Oss komt.

Het innovatieprogramma is officieel van start gegaan in september 2020 en samen met de HAS Hogeschool ontwikkeld. De gemeente Oss was al samen met plaatselijke verpakkingproducenten gestart met een project op te zetten. Dankzij subsidie van de Regio Deal Noord-Brabant kon dit project uitgebreid en uitgebreid worden voor een periode van drie jaar. De bedrijven bepalen de inhoud van het programma en de HAS Hogeschool en de gemeente Oss onderzoeken, faciliteren en promoten het.

## Projecten

Samen met het bedrijfsleven hebben studenten veel verschillende



**'Verpakken is een wezenlijk onderdeel in de gehele keten van een product'**



## HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is het opleidingscentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving. In de twee locaties in Den Bosch en Mierlo volgen 3.700 voltijdstudenten verschillende opleidingen. Daarnaast volgen 600 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen en is de school actief op het gebied van onderzoek en advies.

Naast het hbo bachelor- en bachelordiploma richt HAS Hogeschool zich ook op de markt van zakelijke dienstverlening, via onderzoek, consultancy, opleiding en training in de agro- en foodbusiness en de milieusector.

www.has.nl

onderzoeken bijvoorbeeld of consumenten het erg vinden dat een product dat online wordt gekocht een andere verpakking heeft dan hetzelfde product dat in de winkel in het schap staat. En of extra

gehele aspect rondom de verpakking. De cursus Packaging Projectmanager, die in januari weer van start gaat, is bedoeld voor mensen die zich willen omscholen/bijbelen tot projectma-

Project: Circular Food Center - Innovatieprogramma circulaire verpakkingen

# 5. Conclusies



## Belangrijkste conclusies

- Meeste projecten zijn goed op stoom. Alle projecten geven aan hun doelstellingen binnen de (aangepaste) looptijd te realiseren.
- Projecten zijn zich meer bewust van nut en noodzaak voor een integrale aanpak en bijdrage aan Brede Welvaart.
- Programma en projecten hebben hun organisatie, communicatie, financiën en projectadministratie steeds beter op orde.
- Er is trots in de regio op de Regio Deal; Regio Deal zorgt voor verbinding.
- Er zijn betere contacten tussen projecten en met Rijk, provincie, regio en gemeenten, zowel op bestuurlijk, tactisch als uitvoerend niveau.
- Regio Deal maakt nut en noodzaak van samenwerken duidelijker; Regio Deal is daarmee katalysator regionale samenwerking en één overheidsdenken.





Project: SPARK Makers Zone

## Bijlage 1: Regio Deal in een notendop



# Nu aan de slag

Voor goed leven, fijn wonen en anders werken in Noordoost Brabant!

## ECONOMISCH STERKE REGIO

Bevolking **650** duizend inwoners  
Bruto Regionaal Product **27** miljard euro  
Werkgelegenheid **330** duizend banen

Nationaal op de 6de plaats (van 40 regio's)

**Sterke MKB en familiebedrijven**

Traditie van samenwerken

'Van boer tot bord'  
Agrifood als economisch stuwende factor

## ZORGEN OVER DE TOEKOMST

Stuwende economische kracht zwaar onder druk

Initiatiefnemers:  
Regio Noordoost Brabant samen met Provincie Noord-Brabant, Stichting AgriFood Capital, Stichting OndernemersLift+ en Noordoost Brabant Werkt

## EEN REGIODEAL MET HET RIJK MOET ZORGEN VOOR:

- Versnelling
- Intensivering en/of uitrol van projecten
- Partnerschappen met het Rijk

Past in uitvoering strategische agenda's van de regio.

## AANPAK

## GOED LEVEN

Verbeteren van het leefklimaat

- We werken samen met 'streekholders' aan het behoud en versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van steden, dorpen en het platteland. We houden goede voorzieningen op peil. Samen met het MKB en het onderwijs zetten we in op ontwikkelmogelijkheden en perspectieven op werk voor alle inwoners voor nu en in de toekomst. Met de juiste faciliteiten blijft het talent en daarmee bedrijvigheid voor de regio behouden.

## FIJN WONEN

Slim inrichten van de leefomgeving

- Mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen en van de noodzakelijke transitie in het landelijk gebied, zonder dat deze elkaar gaan bijten, zoeken naar winwin en fors reduceren hinder door schadelijke uitstoot: gebiedsregie door overheden!
- Voorkomen verloedering landelijk gebied, voorkomen criminaliteit en ondermijning, mogelijk maken herinrichting voor andere (groene) functies.

## ANDERS WERKEN

Ontwikkelen van een economisch perspectief

- We realiseren open innovatie zodat AgriFoodsector transformeert naar een veerkrachtige sector die precies, waardevol, verbonden en circulair is. We ontwikkelen nieuwe verdienmodellen en andere bedrijvigheid door slimme toepassingen van nieuwe kennis en (digitale) technologieën. Hiermee kunnen we kringlopen sluiten en voedsel maken én eten met minder verspilling.

## LEVEN

- Voorzieningen verdwijnen
- Jongeren trekken weg

Te Koop

## WONEN

- Leefomgeving onder druk door transitie en sanering veehouderij

ER IS NÚ STURING EN ONDERSTEUNING NODIG!

## WERKEN

- Landbouw:
- Traditioneel werk onder druk en agro-industrie in transitie

**50%** boeren stopt  
**300.000 m<sup>2</sup>** aan stallen komt vrij in landelijk gebied t/m 2022

Robotisering en dataficatie leiden tot een uitstoot van mensen en vragen om anders werken



## Samenhang tussen de pijlers en 17 projecten (actielijnen)

### Sleutelprojecten

Leefbaarheid in de dorpen  
Stallenaanpak - Vitalisering  
buitengebied: versterken  
omgevingskwaliteit en weerbaarheid  
AgroProeftuin De Peel  
AgriFoodInnovation  
Circular Food Center  
Datagedreven AgriFoodregio

### Ondersteuningsprojecten

Nieuwe perspectieven voor  
boeren  
Voedseleductie  
Direct energie uit mest



### Kansrijke projecten

Ontwikkel- en  
duurzaamheidscentrum voor  
Duurzame Eiwitten (ODE)  
GreenTech Park Brabant

### Verbindingsprojecten

Transformatie centra steden  
Klaar voor de banen van nu en  
de toekomst  
SPARK Makers zone  
Puzzelen met ruimte in het  
buitengebied

### Kielzogprojecten

Inzet data voor vitale  
voorzieningen  
Voorzieningen voor  
internationale werknemers




## Financiën: gezamenlijke impuls van € 40 mln.

Totaalpakket Regio Deal:

- € 10 mln. van het Rijk; volledig voorschot is aangevraagd. BCF is ingediend.
- Ca. € 10 mln. van de provincie
- Ca. € 10 mln. cofinanciering van: Gemeenten en waterschappen
- Ca. € 10 mln. overige bijdragen: Bedrijven en kennisinstellingen (deels 'in kind')

**Hefboomeffect is groot!**

Overzicht bijdrage Rijk

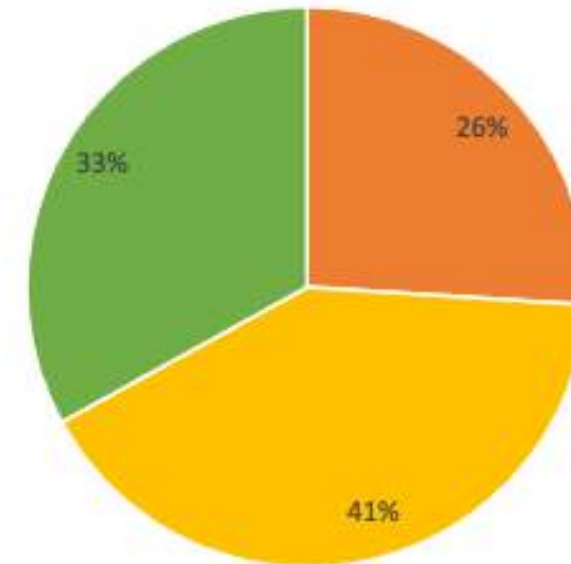

■ Pijler Goed Leven ■ Pijler Fijn Wonen ■ Pijler Anders Werken



**Regio Deal**  
**Noordooost Brabant**

## Regio Deal Noordooost Brabant, dat doen we samen

Inwoners • werkgevers • werkgeversorganisaties • bewonerscollectieven • boeren • tuinders • hightech bedrijven • maakindustrie • basisscholen • horecabedrijven • supermarkten • horecaleveranciers • voedselverwerkende bedrijven • natuureducatiecentra - milieuorganisaties • agrarische collectieven • studenten • vervoersbedrijven • dataspecialisten • ICT-dienstverleners • advies- en onderzoeksinstellingen • voortgezet onderwijs • docenten • lectoren • Ambassadeurs Keep on Learning • maatschappelijke organisaties • lokale en regionale samenwerkingsplatforms • verpakkingsbedrijven • HAS Hogeschool • TU/e • Wageningen UR • Avans Hogeschool • Jheronimus Academy of Data Science (JADS) • mbo onderwijs • praktijkonderwijs • werk- en ontwikkelbedrijven • vakbonden • Werkgeversservicepunt Noordooost-Brabant • Stichting Samen Tegen Voedselverspilling • gemeente Bernheze • gemeente Boekel • gemeente Boxtel • gemeente Heusden • gemeente 's-Hertogenbosch • gemeente Land van Cuijk • gemeente Maashorst • gemeente Meierijstad • gemeente Oss • gemeente Sint-Michielsgestel • gemeente Vught • waterschap Aa en Maas • waterschap De Dommel • RNOB • AgriFood Capital • Noordooost Brabant Werkt • OndernemersLift+ • provincie Noord-Brabant • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • Ministerie van Justitie en Veiligheid • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid



*Project: Direct energie uit mest - HAS-student aan het werk*

## **Bijlage 2: Stand van zaken per project**

<b>Pijler Goed Leven</b>	<u>45</u>
1. Leefbaarheid in de dorpen	<u>46-47</u>
2. Transformatie centra steden	<u>47</u>
3. Voorzieningen voor internationale werknemers	<u>48</u>
4. Inzet data voor vitale voorzieningen	<u>49</u>
5. Voedseleducatie	<u>50</u>
6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst	<u>51</u>
7. SPARK Makers zone	<u>52</u>
8. Nieuwe perspectieven voor boeren	<u>53</u>
<b>Pijler Fijn Wonen</b>	<u>54</u>
9. Puzzelen met ruimte in het buitengebied	<u>55</u>
10. Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid	<u>56</u>
11. AgroProeftuin De Peel	<u>57</u>
<b>Pijler Anders Werken</b>	<u>58</u>
12. AgriFood Innovation	<u>59-60</u>
13. Ontwikkel- en Expertisecentrum voor duurzame dierlijke eiwitten (ODE)	<u>61</u>
14. Circular Food Center	<u>62-63</u>
15. GreenTech Park Brabant	<u>64</u>
16. Direct energie uit mest	<u>65</u>
17. Datagedreven Agrifoodregio	<u>66-67</u>





## GOED LEVEN

### Verbeteren van het blijklimaat

- We werken samen met 'streekholders' aan het behoud en versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van steden, dorpen en het platteland. We houden goede voorzieningen op peil. Samen met het MKB en het onderwijs zetten we in op ontwikkelmogelijkheden en perspectieven op werk voor alle inwoners voor nu en in de toekomst. Met de juiste faciliteiten blijft het talent en daarmee bedrijvigheid voor de regio behouden.



## 1. Leefbaarheid in de dorpen

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Ontwikkelen en uitvoeren van plannen om kleine kernen aantrekkelijk te houden om er te blijven wonen.</p> <p>Er zijn 4 ontwikkellijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dorpen werken samen aan 5 samenwerkingsinitiatieven.</li> <li>2) Initiatiefrijk dorp. Versnelling en zichtbaarheid van 5 dorpsinitiatieven (kernendemocratie).</li> <li>3) Gemeente neemt initiatief. Concrete plannen voor ieder dorp in gemeente Sint Anthonis.</li> <li>4) Verbindende en overkoepelende activiteiten.</li> </ol>		<p>Dit programma maakt het mogelijk om projecten voor en/of door inwoners uit te voeren. In totaal zijn 9 projecten door de stuurgroep goedgekeurd met daarbij ook forse eigen bijdragen. In het kader de ontwikkellijn 'Dorpen werken samen' is 'de Food Tour langs 33 kernen in het Land van Cuijk' afgerond en 'de eerste 1000 dagen van een kind' is op stoom. Klimaatplein Heusden heeft het project 'Gebiedsorganisatie en gebiedsfonds Heusden' gereed om in uitvoering te brengen. In de tweede lijn valt het dorpsplan van Stichting Eigen Kweek Langenboom, wat door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert is goedgekeurd en het project 'kernendemocratie'. Van de 33 kernen het Land van Cuijk het is KernenCV gereed. Twee dorpsinitiatieven, die in de oorspronkelijke opzet waren meegenomen, uit Schaijk en Vierlingsbeek, worden definitief niet langer onder de Regio Deal uitgevoerd omdat het niet mogelijk was om vanuit deze middelen investeringen in gebouwen te bekostigen. In de derde lijn zijn 4 initiatieven ondersteund: de 'Vitaliteitsscan wijk- en gemeenschapshuizen van de gemeente Meierijstad' en 'Bruisende Brinkkiosk' in de voormalige gemeente Sint Anthonis. Er wordt voor elk dorp uit deze gemeente nog een concreet plan ingediend. Een student Bestuurskunde doet onderzoek naar de processen voor bewonersparticipatie in de twee gemeenten Sint Anthonis en Cuijk.</p>

		Kennisdeling en verbidende activiteiten via o.a. kernennetwerk, eigen nieuwsbrief, nieuwsbrief RNOB, <a href="#">Facebook Community Leefbaarheid in de dorpen</a> en <a href="#">LinkedIn Community Leefbaarheid in de dorpen</a> en een leertraject van kennissessies. De tweede sessie ging over besturen van dorpshuizen. <a href="#">Vereniging Kleine Kernen</a> en <a href="#">ZET</a> zijn actief betrokken. 8 november was het werkbezoek van Europarlementariër Tom Berendsen.
€ 4.793.000 (€ 1.000.000)		De besteding blijven achter. De co-financieringsverklaringen zijn nog niet rond. Er vindt nog gesprek voor maart plaats of derde voorschot betaald kan worden. In het gesprek ook aandacht voor het doorleggen van gelden, nu nog onduidelijk hoe administratie en verantwoording gedaan wordt.
01-10-2020 t/m 31-12-2022		De looptijd van dit project wordt waarschijnlijk verlengd. Niet alle projecten, zoals bijvoorbeeld in Langenboom zijn eind 2022 afgerond. Dit punt komt bij volgend voortgangsgesprek terug.



## 2. Transformatie centra steden

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
Delen van kennis en lokale ervaringen gericht op het verminderen van het aantal m2 winkelruimte en het terugbrengen van wonen en groen in het centrum.		Poho Economie heeft op 23 september '21 ingestemd met plan van aanpak. Eind november is projectleider voor fase 1, opstellen geactualiseerde regionale detailhandelsvisie, gestart.
€ 200.000 (€ 75.000)		Projectfiche en nulmeting worden door nieuwe gemeente Land van Cuijk ingediend, dus in januari 2022.
01-07-2021 t/m 31-12-2023		Door de latere start is de looptijd van het project in het startgesprek met een jaar verlengd naar december 2023.

 <b>3. Voorzieningen voor internationale werknemers</b>		
Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
Maken van regionale afspraken over - ook grootschalige - huisvesting (kwaliteit, ambitie, toezicht en handhaving), integratie en participatie (sociaal domein) en onderzoek naar een regionaal Migratie Informatiepunt (MIP).		Het handelingsperspectief 'Huisvesting, integratie en participatie van internationale werknemers in de regio Noordoost-Brabant', positedocument en bijlagen zijn gedeeld met regionale bestuurders en daarna met raadsleden. Het onderzoek naar een MIP is afgerond.
€ 200.000 (€ 0)		Bestedingen liggen op koers. Over de co-financieringsverklaringen zijn afspraken gemaakt.
01-09-2020 t/m 31-08-2022		Project is enkele maanden later gestart dan aanvankelijk aangevraagd, maar blijft vooralsnog staan op de aangegeven 2 jaar. De looptijd is hierop in het schema aangepast.

Gewijzigde projectnaam: voorheen 'Voorzieningen voor arbeidsmigranten'



#### 4. Inzet data voor vitale voorzieningen

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Ontwikkelen dashboard om data over vervoersbewegingen van kwetsbare inwoners naar publieke voorzieningen te vertalen naar bruikbare informatie en oplossingen.</p>		<p>De interface en 'bibliotheek' data omschrijvingen voor het dashboard zijn gereed. Er wordt nu gewerkt aan visualisatie van de antwoorden op de onderzoeksvraag. Een demonstratie-desk wordt ingericht. Tevens zal deze desk gebruikt worden om het gebruiksgemak verder te verbeteren.</p>
<p>€ 60.000 (€ 0)</p>		<p>De basis wordt bekostigd door gemeente Uden. Voor het gebruik van de portal en doorontwikkeling wordt een verdienmodel opgezet. Bestedingen liggen op koers en co-financieringsverklaring is ontvangen. Gemeente Uden heeft RIF aanvraag 'Impact van data' van ROC de Leijgraaf mee ondersteund.</p>
<p>01-09-2020 t/m 31-12-2024</p>		<p>Data verzamelen is een continu proces.</p>






## 5. Voedseleducatie

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Ontwikkelen interactief, gevalideerd lesprogramma over voedsel voor het primair onderwijs in het hele land samen met Food Valley en Greenport Venlo.</p>		<p>Dit project blijft vertraging ondervinden door corona. Het is daarom onbekend wanneer de eerste pilot op 3 basisscholen in Meierijstad, Cuijk en Uden kan starten. De voorbereidingen zijn gedaan en materialen liggen klaar. De stichting 'Keukenkanjers' is opgericht en voert het project in deze en andere regio's verder uit.</p>
<p>€ 450.000 (€ 150.000)</p>		<p>Veel minder uitgaven gedaan vanwege corona. Mogelijk wordt begroting niet volledig gerealiseerd. Over de co-financieringsverklaring zijn afspraken gemaakt. Termijnbetaling wordt opgeschort.</p>
<p>01-09-2020 t/m 31-12-2023</p>		<p>In het voorjaar wordt nieuwe planning opgesteld. Bij volgende voortgangsgesprek meer duidelijkheid over looptijd.</p>



## 6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Werken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt, met wendbare en weerbare mensen en organisaties, die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen en waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen.</p>		<p>Er blijven gemiddeld 13-14 aanmeldingen per week voor vragen over werk en loopbaan bij <a href="#">Wijzer in je Werk</a>.</p> <p>Door corona zijn er minder nieuwe filmpjes opgenomen. In totaal 122, waarvan 50 in 2021 filmpjes en 119 mensen aan het werk vanuit <a href="#">Talentuit Noordoost Brabant</a>.</p> <p>Het Regionaal Mobiliteitsteam is gestart. Om het aanbod voor werkgevers beter inzichtelijk te maken, willen partners in de regio toewerken naar 1-portaal.</p> <p>Community platform <a href="#">Keep on Learning</a> voor werkgevers is vanaf maart in de lucht. Twee estafette stokjes zijn uitgereikt.</p> <p>70 bedrijven volgen traject <a href="#">Duurzame inzetbaarheid</a>. De eerste vouchers SLIM subsidie zijn vergeven. Er zijn drie bijeenkomsten geweest voor ondernemers mbt leer- en ontwikkelcultuur.</p> <p>Doorstart <a href="#">ZZP NOB Boost</a>, met een groeiend aantal volgers op social media van bijna 3.700.</p> <p>Drie sessies zijn geweest over het nieuwe werk op korte en langere termijn. Krapte kan niet alleen worden opgelost, met aanpalende beleidsterreinen zoals wonen en economie zijn verkenningen geweest. De stijging van de jeugdwerkloosheid (1,8%) ligt lager dan het landelijke gemiddelde (2,5%). Het projectplan laaggeletterden is regionaal bestuurlijk vastgesteld.</p>
<p>€ 3.650.000 (€ 1.000.000)</p>		<p>Bestedingen liggen op koers. Co-financiërs- verklaring is binnen.</p>
<p>10-07-2020 t/m 31-12-2023</p>		<p>De verwachting is dat project zowel inhoudelijk als financieel binnen looptijd is afgerond.</p>

 <b>7. SPARK Makers Zone</b>		
Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Coachen jongeren in (digitaal) vakmanschap en ambacht in maaksectoren. SPARK Makers Zone is open voor iedereen die zich wil verdiepen in de toekomst van maken met inzet van nieuwe vaardigheden en technologieën, zoals slim en circulair bouwen.</p>		<p>9 jongeren hebben certificaat <a href="#">techniek oriëntatie programma</a>. behaald en hebben zicht op een (leer)baan. Nieuwe groep van 17 deelnemers is gestart. De connectie is gemaakt met Bossche City Deal kennismaken zodat 11 jongeren deelnemen aan ondernemerschap editie.</p> <p>27 bedrijven die vernieuwing nastreven hebben gebruik gemaakt van faciliteiten van <a href="#">SPARK Makers zone</a>, een BOOST ter waarde van 5.000 euro.</p> <p>100 bedrijven hebben SPARK Makers zone bezocht voor rondleiding, gesprek, of bijeenkomst.</p> <p>100 studenten (mbo en hbo) maken gebruik van de faciliteiten.</p> <p>Voor challenge 'Close the loop' waren 20 inzendingen (6 finalisten) met 50 bezoekers aan het slotevenement.</p> <p>De haalbaarheidsstudie naar Smart industry fieldlab is succesvol afgerond. De doorontwikkeling naar een learning community (fase 2) is in november formeel van start gegaan met eerste koplopers bijeenkomst.</p>
<p>€ 545.000 (€ 200.000)</p>		<p>Bestedingen liggen op koers. Co-financieringsverklaringen zijn ontvangen. Financiële bijvangst: Aanvraag voor fase 2 van het Smart industry fieldlab (55.000 euro) is door de provincie goedgekeurd, maar is geen onderdeel van de publieke co-financiëring van de Regio Deal.</p> <p>SPARK Makers zone is onderdeel van de EU REACT subsidie Hybride Leeromgeving gemeente 's-Hertogenbosch.</p>
<p>01-09-2020 t/m 30-09-2023</p>		<p>Het deel voor de bedrijven is eind 2022 afgerond. Het techniek oriëntatie programma loopt langer door vanwege latere start door corona.</p>



## 8. Nieuwe perspectieven voor boeren

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p><a href="#">Begeleiden door bedrijfsexperts en coaches</a> van 18 stappende boeren naar andere bron van inkomsten.</p>		<p>De eerste groep met 5 deelnemers is in november gestart. De werving kostte veel meer tijd en inspanning dan vooraf gedacht. Er was meer medewerking van gemeenten en andere Regio Deal project verwacht. Er zijn nu meerdere geïnteresseerden zodat een tweede groep naar verwachting snel kan starten.</p>
<p>€ 180.000 (€ 130.000)</p>		<p>In kind bijdrage provincie (overige financiering) voor het inspiratietraject kan vanwege andere prioriteiten van het nieuwe provinciale bestuursakkoord niet worden ingevuld. Er wordt gekeken op welke wijze de provincie dan invulling kan geven aan hun toezegging op het programma.</p>
<p>01-09-2020 t/m 01-04-2023</p>		



## **FIJN WONEN**

### **Slim inrichten van de leefomgeving**

- Mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen en van de noodzakelijke transitie in het landelijk gebied, zonder dat deze elkaar gaan bijten, zoeken naar winwin en fors reduceren hinder door schadelijke uitstoot: gebiedsregie door overheden!
- Voorkomen verloedering landelijk gebied, voorkomen criminaliteit en ondermijning, mogelijk maken herinrichting voor andere (groene) functies.





## 9. Puzzelen met ruimte

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Een groepje van experts ('koppelteam') helpt gemeenten om samen met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen diverse gebiedsvraagstukken in 7 gebieden zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Het koppelteam beschikt over een budget om, waar nodig, die ruimtelijke arrangementen aan te jagen en te stimuleren.</p>		<p>Het interdisciplinair koppelteam (waterschap, provincie, gemeente, RNOB) is operationeel.</p> <p>Bij drie gebieden liggen concrete eerste koppelverzoeken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maasheggen: koppeling tussen gebiedsontwikkeling en recreatie/cultuurhistorie;</li> <li>2. Aadal: koppeling tussen gebiedsontwikkeling en aanpak stikstof (GGA groen blauw): opstellen parapluplan voor de verschillende deelgebieden in Aadal;</li> <li>3. Vught/Margriet: parapluplan en gebiedsproces voor buitengebied Vught en koppeling aan stikstofaanpak Natura2000 Vlijmens Ven/Bossche Broek.</li> </ol> <p>4 van de 7 gebieden (Aadal Noord, Raamvallei, Nieuw Laar, Margriet) kampen momenteel met capaciteitsproblemen bij gemeenten. Bij één gebied (Dommelvallei) is het capaciteitsprobleem onlangs opgelost. Eén project (Maashorst) lag vanwege governance vraagstukken stil.</p> <p>In 2 gebieden (Laar- Nieuw Laar en Maasheggen) wordt de methodiek Vital Zone toegepast o.a. om de beleidswereld en de belevingswereld met elkaar te verbinden.</p>
<p>€ 4.250.000 (€ 1.650.000)</p>		<p>Forse onderrealisatie op Rijksbijdrage deel (nog geen 10% besteed). Financiële administratie bij de 7 gebieden nog niet goed ingericht op registratie van publieke co-financiëring.</p> <p>Co-financieringsverklaringen zijn nog niet ontvangen, omdat gewerkt wordt aan een voorstel om de co-financiëring te koppelen aan één gebiedsproces. Dat scheelt in administratie.</p> <p>Aangepast projectfiche met begroting wordt ingediend voor directeurenoverleg januari 2022. Termijnbetaling wordt 1 periode opgeschort. Medio 2022 herijking inzet rijksmiddelen</p>
<p>01-01-2021 t/m 31-12-2023</p>		<p>De looptijd van dit project wordt verlengd tot 31-12-2024.</p>



## 10. Stallenaanpak, vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>10 integrale gebiedsontwikkelingstrajecten in 7 gemeenten, ruimte bieden voor economische ontwikkelingen door saneren stallen. Pilot vergroten weerbaarheid om ondermijning tegen te gaan. Deelbaar en overdraagbaar maken van methodiek en ervaringen op het gebied van gebiedsgerichte aanpak die bijdragen aan vitaal en weerbaar buitengebied.</p>	<p style="background-color: green; color: white; text-align: center;">Op koers</p>	<p>De 10 gebieden bij 5 gemeenten zijn in oktober '21 definitief geselecteerd. Veel interesse bij deelnemende negen gemeenten (bestuurders en ambtenaren) om kennis en ervaringen te (gaan) delen en samen op te trekken richting provincie en Ruimte voor Ruimte.</p> <p>De pilot 'Samen de handen uit de mouwen' om ondermijning in het buitengebied tegen te gaan is gestart. Een indicatoren set om kwetsbaarheid inwoners buitengebied is in ontwikkeling. Er is externe capaciteit ingehuurd voor ontwikkeling juridische instrumenten.</p>
<p>€ 2.600.000 (€ 1.300.000)</p>	<p style="background-color: orange; color: white; text-align: center;">Op koers</p>	<p>Besteding rijksdeel ligt op koers. Er is nog geen realisatie op de overige publieke-cofinanciering. Die worden pas gedaan als de geselecteerde gebieden aan de slag gaan. Collegebesluiten voor de co-financiëring zijn aangeleverd, raadsbesluiten volgen in 2022. De resterende termijnbetalingen worden verdeeld over 4 i.p.v. 2 termijnen.</p>
<p>01-09-2020 t/m 31-12-2024</p>	<p style="background-color: green; color: white; text-align: center;">Op koers</p>	



## 11. AgroProeftuin de Peel (APdP)

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Field lab voor agrarische vernieuwing in Noordoost-Brabant. Hier werken agrarische ondernemingen samen met kennisinstellingen en overheden aan de omslag naar kringlooplandbouw. Hierbij worden onder meer instrumenten ingezet als een bijdrage- en subsidieregeling voor ondernemers; experimenteerruimte; lokaal verankerde en door boeren, inwoners en overheden vertrouwde monitoring; en kennisverspreiding.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 aanvragen <a href="#">subsidieregeling Kringlooplandbouw</a> verleend (maximaal 50.000 euro subsidie).</li> <li>- 4 bedrijven toekenning van <a href="#">bijdrageregeling Kringlooplandbouw</a> (maximaal 5.000 euro bijdrage).</li> <li>- 9 systeemveranderings-projecten gestart.</li> <li>- 16 experimenten op de <a href="#">proeflocatie</a> in uitvoering.</li> <li>- Uitvoering van monitoringsactiviteiten in het kader van het boeren innovatienetwerk en veehouderij en akkerbouw.</li> <li>- Er worden diverse proeven gedaan bij individuele telers gericht op bodem, water en lucht. Metingen worden later openbaar beschikbaar gesteld.</li> <li>- Samenwerking met kennisinstellingen (mbo, hbo en wo) wordt verder uitgebouwd gericht op onder andere bodem en kringlooplandbouw.</li> </ul>
<p>€ 3.040.000 (€ 1.000.000)</p>		<p>Bestedingen lopen volgens planning. Over co-financiëringsverklaringen zijn afspraken gemaakt. Financiële bijvangst: additionele financiering is toegezegd vanuit IBP-VP voor het initiatief 'Verbonden proeftuinen voor Slimme Rotatieteelten'</p>
<p>10-07-2020 t/m 31-12-2024</p>		<p>Streven is om eerder, eind 2023, de projectactiviteiten afgerond te hebben.</p>



## ANDERS WERKEN

### Ontwikkelen van een economisch perspectief

- We realiseren open innovatie zodat AgriFoodsector transformeert naar een veerkrachtige sector die precies, waardevol, verbonden en circulair is. We ontwikkelen nieuwe verdienmodellen en andere bedrijvigheid door slimme toepassingen van nieuwe kennis en (digitale) technologieën. Hiermee kunnen we kringlopen sluiten en voedsel maken én eten met minder verspilling.



## 12. AgriFood Innovation (AFI)

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>AFI generiek: het versterken van de verbinding tussen bedrijven en kennisinstellingen in de agrifood en de innovatieve maakindustrie, 2 systeemspongen en vier businesscases op snijvlak agrifood, high Tech, data en ICT:</p> <p>Systeemspong Digitale gewasketen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Slimmer Telen</li> <li>2) Autonome akker</li> </ol> <p>Systeemspong Slimme Varkensketen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Sturen en sorteren op kwaliteit</li> <li>4) Verbeteren niveau van diergezondheid</li> </ol>		<p>AFI is nauw betrokken bij de provinciale Innovatieagenda Landbouw en Voedsel voor de zogenaamde drivers smart farming dierlijk, smart farming plantaardig eiwittransitie en reststroomverwaarding/ tegengaan van voedselverspilling. In samenwerking met de driverteams zijn ideeën opgehaald waarvan naar verwachting in Q1 2022 twee tot vier nieuwe businesscases worden opgestart. Zo wordt mede vormgegeven aan het uitbouwen en verduurzamen van de <a href="#">AFI-community</a> AgriFood High Tech.</p> <p><b>Slimmer Telen</b></p> <p>Voorbereiding voor dit project (o.a. dashboard, cursusprogramma telen met high tech/data), zijn in afrondende fase. De eerste telers starten in januari '22 met de cursus. Na afronding in april wordt duidelijk hoeveel telers het dashboard gaan gebruiken. Er is samenwerking met IBP Verbonden proeftuinen om het aanbod voor teeltbeslissingen beter af te stemmen op vragen en ketenwensen. Een virtual twin (virtuele representatie) is over 6 maanden gereed. Het validatieprogramma voor het volgende teeltseizoen wordt deze winter opgesteld zodat in het voorjaar de innovaties kunnen worden getest.</p> <p><b>Autonome akker</b></p> <p>Vijf agrofood bedrijven zijn gestart met het Pixelfarming Robotics on boarding programma met als doel robot 1 te valideren. Het werven van een volgende groep is gestart. Proefvelden voor de gewassen sperziebonen, suikerbieten en chicorei zijn aangelegd. Er wordt een netwerk met Duitsland opgezet.</p> <p>Met kennisinstellingen (hbo en wo) wordt gewerkt aan gewasherkenning en Smart Biology, het digitaal maken van biologische kennis tot slimme technieken voor optimale teelt.</p> <p><b>Sturen en sorteren op kwaliteit</b></p> <p>De vision technologie is geïnstalleerd in een slachtlijn voor metingen aan de ham van het varken.</p> <p>Er zijn 2 offline metingen uitgevoerd om de effecten van genetica op vetkwaliteit verder in kaart te brengen.</p>



		<p>Uit onderzoek is gebleken dat vechtstrepen op de ham negatief effecten hebben op de verwerkbaarheid tot eindproduct.</p> <p>Een ander onderzoek richt zich op data over joodadditiegetal en de effecten op vetkwaliteit. De uitkomsten van beide onderzoeken worden in de toekomst ook gecombineerd met de vison technologie.</p> <p><b>Verbeteren niveau van diergezondheid</b></p> <p>De eerste sensoren zijn getest en de data zijn geanalyseerd. De resultaten zijn teruggekoppeld aan de deelnemers. De tweede batch sensoren is onderweg.</p> <p>Een PhD heeft onderzoek gedaan naar karkassamenstelling in combinatie naar stalfactoren. 5 metingen kunnen voor 92% de karkassamenstelling voorspellen. Een nieuwe PhD student start vervolg onderzoek.</p>
€ 11.770.000 (€ 1.350.000)		<p>Bestedingen blijven achter. Over de co-financieringsverklaringen zijn afspraken gemaakt. De volgende termijn wordt niet uitbetaald. Afhankelijk van de financiële realisatie volgende termijn 2 betalingen ineens.</p> <p>De ondernemer/leadpartner (businesscase Slimmer telen) heeft eerste gesprekken met de provincie over de lening gehad. Dit krijgt begin 2022 een vervolg.</p>
10-07-2020 t/m 10-07-2023		<p>De einddatum wordt mogelijk niet gehaald omdat provinciale beschikking later kwam dan voorzien. Ook corona levert vertraging. Het project gaat bij provincie om verlenging van de looptijd vragen tot dec '24. Er wordt ook een voorstel bij de provincie gedaan om SiSa als eindafrekening te accepteren.</p>



### 13. Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE)

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Haalbaarheidsonderzoek en het zetten van eerste stappen tot verdere uitwerking van een ontwikkel- en expertise centrum voor duurzame, dierlijke eiwitten.</p>		<p>Ruim 60 personen zijn geïnterviewd over de vormgeving, de invulling, businessstructuur van ODE. De behoefte aan een ontwikkelcentrum als ODE groeit zichtbaar. De vragen uit het stuurgroep overleg van mei '21 zijn besproken met stakeholders. Dit is een extra stap. In december '21 is een overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Drie bedrijven hebben zich geïnterviewd om plaats te nemen in de stuurgroep.</p>
<p>€ 400.000 (€ 100.000)</p>		<p>Besteding blijft achter. Beschikking provincie wordt eind december verstuurd met drie aanvullende voorwaarden n.a.v. bespreking in GS en met op maat afspraken over eindafrekening: naar rato wordt alleen toegepast op middelen die door AFC worden ingezet. Termijnbetaling van de kassier is nodig omdat het project nog niet beschikt over provinciale middelen.</p>
<p>01-10-2020 t/m 31-12-2022</p>		



## 14. Circular Food Center (CFC)

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Wereldwijd koploper en voorbeeld zijn in de aanpak van verspilling. Ondernemers en onderzoekers ontwikkelen er samen met studenten businesscases, onderzoek-, onderwijs- en ontwikkelingsprogramma's om de ketens van voedsel en voedselverpakkingen verspillingvrij te maken.</p>		<p><b>Circular Food Center</b></p> <p>Meer dan 100 stakeholders zijn aangesloten bij Stichting Tegen Voedselverspilling. Aan de <a href="#">Verspillingsvrije week</a> deden 130 partners actief mee, waaronder diverse stakeholders en 30 gemeenten. Portretten van verschillende verspillingvrije helden zijn een maand geëxposeerd en nu nog zichtbaar op de <a href="#">website</a>.</p> <p>Cluster van 10 bedrijven werkt aan 5 concrete businesscases voor het toepassen van rest- en bijstromen uit de voedingsmiddelensector voor veevoer (circulaire dierlijke eiwitketen)</p> <p>De samenwerkingen met het onderwijs (hbo/wo) is in stroomversnelling gekomen. Dat komt mede door toekenning van het SIA-NWO project 'Voorkomen voedselverspilling'</p> <p>Er zijn dit schooljaar zowel MBO (derde editie) als een HBO challenge (1e editie). Door 40 HBO studenten wordt gewerkt aan 13 cases. De inschrijving voor MBO challenge is gestart.</p> <p>Drie ontwikkelingsprogramma's: Sociaal maatschappelijke menukaart, Ketenaanpak Brood en de samenwerking met SIFAV (groenten en fruit import ketens) komen voort uit de businesscases en zijn in verregaande vorm van ontwikkeling.</p> <p>Het is de intentie om in 2022 een extra publiek-privaat ontwikkelproject te starten voor een hybride leer-, werk- en inspiratieomgeving Circular Food Centrum, in samenwerking met The Chocolate Factory.</p>

		<p><b>Innovatieprogramma circulaire verpakkingen</b></p> <p>De eerste 3 onderzoekslijnen zijn aan het einde van het schooljaar afgerond en <a href="#">gepresenteerd</a> aan deelnemers van het Innovatieprogramma Verpakkingen Oss. In september is gestart met verkenning voor 3 nieuwe onderzoekslijnen met HAS studenten en verpakkingsbedrijven in Oss. Het aantal minoren bij het HAS is verlaagd. In plaats daarvan komt er een module circulair verpakken. In mei en oktober hebben HAS studenten deze module doorlopen waarbij ze in 5-10 weken een bedrijfsgerichte opdracht uitvoeren. Drie bedrijven zijn gestart met Business model Template van de Kracht van Oss. Voor twee bedrijven is het traject afgerond en kreeg het een vervolg in een businesscase. De werving voor nieuwe bedrijven is in september gestart.</p> <p>Het online event <a href="#">Dag van de duurzame verpakking</a> had 380 bezoekers. Landelijk wordt via advertentie in foodmagazine aandacht verkregen voor het innovatieprogramma.</p>
€ 4.850.000 (€ 870.000)		<p>Door late beschikking loopt besteding op publieke co-financiëring achter. Op het rijksdeel is wel voldoende besteding. Er is gesprek met gemeente Oss over BTW.</p>
01-10-2020 t/m 31-12-2023		



## 15. Green Tech Park Brabant (GTPB)

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Door inzet van een participatieve en gebiedsgerichte aanpak passend bij de nieuwe omgevingswet de ontwikkeling van een regionale broedplaats voor innovatieve startups (de 'Incubator') op een duurzaam en/of circulair bedrijventerrein met kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid.</p>		<p>Nieuw college van B&amp;W van de gemeente Boxtel heeft begin 2021 de doelstellingen voor het bedrijventerrein verbreed naar een duurzaam en/of circulair bedrijventerrein met kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid. De gebiedsdagen zijn half jaar vertraagd omdat eerst ambitie en afwegingskader moest worden opgesteld en vinden nu plaats op 18 januari '22. Ondanks dit uitstel is planning voor het onderwerp omgevingsplan nog haalbaar. Voldoende rechten kunnen worden aangekocht om plan te laten doorgaan. Er is ook al aantal bedrijven wat interesse heeft.</p>
<p>€ 250.000 (€ 100.000)</p>		<p>Besteding op de publieke co-financiëring blijft achter vanwege later indienen aanvraag bij de provincie. Co-financieringsverklaring over inzet gemeentelijke middelen moet nog worden ingediend. Financiële bijvangst: er is aanvraag gedaan bij stimuleringsfonds circulaire innovatie (17K) voor inzet extra stedenbouwkundige.</p>
<p>01-08-2020 t/m 01-03-2023</p>		



## 16. Direct energie uit mest

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Haalbaarheidsstudie, samen met vier melkveehouders , ontwikkelaars en HAS, naar een bewerkingsmethode (monovergister) om op locatie energie uit koeienmest te produceren en te verwaarden.</p>		<p>Eerste groep HAS studenten hebben in juni opdracht afgerond. Tweede groep HAS studenten is in september gestart voor vervolg onderzoek naar afzetmogelijkheden energie en reststromen. De proefinstallatie op melkveebedrijf is Oss (verwerking 1.000 liter mest) is eind september geplaatst. Er waren opstart problemen. Zodra de installatie stabiel draait worden kijkdagen georganiseerd. Een animatie over het systeem en nut en noodzaak wordt gemaakt.</p>
<p>€ 355.000 (€ 75.000)</p>		<p>Bestedingen lopen fors achter vooral door vertraging levering proefinstallatie. Termijnbetaling wordt opgeschort. Co-financiëringsverklaringen zijn ontvangen.</p>
<p>10-07-2020 t/m 31-12-2024</p>		<p>Gefaseerd: pilot fase t/m 2022, vervolg naar full-scale eind 2024.</p>





## 17. Datagedreven Agrifoodregio

Doelen	Op koers?	Resultaten en bevindingen
<p>Model van informeren, inspireren, activeren, equiperen, waarderen en implementeren toepassen.</p> <p>Jong, goed gekwalificeerd data-talent (400) stroomt de sector in en blijft behouden voor de regio.</p> <p>Ondernemers en medewerkers in de regionale mkb agrifoodketen (150) en 'het peloton' van mkb-bedrijven in de regio (150), gaan structureel aan de slag met het inzetten van (hun eigen) data in hun business en nieuwe businessmodellen (vouchers).</p> <p>Een 'beweging' ontstaat waar jongeren, ondernemers en medewerkers actief aan bijdragen. Deze beweging zet digitalisering en dataficering in om te komen tot een financieel 'faire' agrifoodketen, waar de rendementen evenwichtig verdeeld zijn en een hefboom naar een circulaire, diervriendelijke, grondstoffefficiënte en lokale agrifoodketen.</p>		<p>De projectorganisatie is ingericht. Er zijn veel tussentijdse wisselingen in de projectorganisatie wat voor vertraging heeft gezorgd. Er zijn coördinatoren per onderdeel en stuurgroep overleg van de drie partners van het consortium. Inhoudelijke projectcoördinatie is vanaf november '21 belegd bij JADS. 85 studenten (wo en hbo) actief met afstudeerproject in AgriFood bedrijfsleven en 45 studenten hebben succesvol minor AgriFood en data afgerond. Verankering bij onderwijsinstellingen JADS/HAS/AVANS (en KW1C) wordt gedaan via Datalab AgriFood loket.</p> <p>58 ondernemers zijn geholpen bij vraagstukken over slimme inzet en/of verwaarden van data. Het aantal leads bij Driven by Data is in Q2 en Q3 teruggevallen. Oorzaken zijn onzekerheid over voortbestaan consortium en onvoldoende aandacht voor de klantreis. Na de datacoach is er maar beperkt aantal ondernemers (11) die vervolgroute richting datalabs en/of expertbedrijven vinden en data verwaarden. Het aantal van 300 voor verwaarden zoals bij de aanvraag vermeld, blijkt overschat. Corona en economische ontwikkelingen maken dat Mkb'ers weinig ruimte hebben voor nieuwe dingen.</p> <p>Er komt een aangepast projectfiche waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt. Dit fiche wordt besproken in het directeurenoverleg januari 2022.</p>

		<p>8 ondernemers volgden de workshop tijdens Dataweek NL. CyberCommon, e-infrastructuur en high performance computing &amp; visualisatie omgeving waar datamethoden en databronnen slim worden gecombineerd en beschikbaar gemaakt, is nu in de vraag gestuurde ontwerpfase.</p> <p>Diverse activiteiten om de community Driven by Data uit te breiden, challenges en events zijn geweest: Internationale Data Driven AgriFood Future Symposium (oktober), Nederlandse Tag, symposium AgriFood &amp; Data (maart), DataWeekNL (oktober).</p> <p>Daarnaast wordt samenwerking gezocht met bedrijfsverzamelgebouwen en innovatiehubs.</p>
€ 2.062.531 (€ 700.000)		<p>Beschikking provincie is nog niet ontvangen en dus niet besteed. Op rijksmiddelen is onderbesteding. Termijnbetaling wordt opgeschort.</p>
01-07-2020 t/m 31-12-2022		<p>Doordat provinciale beschikking nog niet is ontvangen en vanwege corona heeft project bijna jaar vertraging opgelopen. In het nieuwe projectfiche 9.0 wordt nieuwe looptijd aangegeven.</p>
