



# Regio Deal Noordoost Brabant

Bijlage voortgang  
per project (lopend  
en afgerond)

## Rapportage 7: Tussentijdse voortgang

Periode: juli 2020 - november 2023



Rijksoverheid

Provincie Noord-Brabant





# Inhoudsopgave

---

1. Samenvatting	<a href="#"><u>3</u></a>
2. Resultaten en voortgang op de 17 projecten	<a href="#"><u>5</u></a>
2a. Inhoudelijke voortgang	<a href="#"><u>10</u></a>
2b. Financiële voortgang	<a href="#"><u>16</u></a>
2c. Looptijd en planning	<a href="#"><u>19</u></a>
3. Brede Welvaartsmonitor	<a href="#"><u>21</u></a>
4. Publiciteit en communicatie	<a href="#"><u>25</u></a>
5. Samenwerking	<a href="#"><u>27</u></a>

---



*Samen met onze partners vierden we dit jaar drie jaar Regio Deal!*

# 1. Samenvatting



## Samenvatting 3 jaar Regio deal in uitvoering

- Zeven projecten zijn succesvol afgerond.
- Twee projecten zijn voortijdig beëindigd.
- 11 projecten zijn in uitvoering, waarvan drie nieuwe projecten.
- *'Transformatie centra middelgrote steden'* moet nog veel inspanningen leveren om de gewenste resultaten te behalen. De overige projecten hebben goed in beeld wat zij in het laatste uitvoeringsjaar nog willen realiseren. Het blijft lastig voor de meeste projecten om te beoordelen of zij de begroting volledig gaan realiseren.
- De opgaven waaraan in de deal wordt gewerkt, zijn nog steeds actueel. De drie nieuwe projecten sluiten aan op deze opgaven.
- Resultaten en ervaringen worden onderling gedeeld. Dit heeft een olievlekwerking op de kennisontwikkeling in de regio.



*Eindgesprek met de projectleider en de bestuurlijke trekker (project 4. Inzet data voor vitale voorzieningen)*

## 2. Resultaten en voortgang op de 17 projecten

a: Inhoudelijke voortgang | b: Financiële voortgang | c: Looptijd en planning



## Resultaten 17 projecten juli 2020 - nov 2023

11 projecten in uitvoering, 7 projecten afgerond, twee projecten voortijdig beëindigd, 22 dorpsinitiatieven  
19 gebiedsprocessen 6 community's: Leefbaarheid in de dorpen, Circular Food Center, Smart  
Circulair Construction, AgroProeftuin de Peel, AgriFood Innovation, ZZP NOB Boost 51 afstudeer- of  
bedrijfsopdrachten 56 deelnemers techniekoriëntatie 2 handelingsperspectieven: internationale  
werknemers en detailhandelsvisie 24 nieuwe perspectieven voor agrarische ondernemers 4 mbo en 3 hbo  
challenge 21 businesscases 1 Werkcentrum 8 tools: Data-Exchange portal, vitaliteitsscan dorpshuizen,  
leefbaarheidsmonitor, DI-scan, Talentuit, indicatorenset, huurovereenkomst, stappenplan gemeenten  
tegengaan verspilling, Brabant Leert 60 pilots voor nieuw product, dienst of centrum 1 Magazine (samen)  
verpakken we de toekomst 4 systemsprongen: Slimme varkensketen, digitale gewasketen,  
kringlooplandbouw en tegengaan verspilling 180 leerlingen voedseducatie 215 bijdragen aan innovaties  
115.000m2 stallen gesloopt

voortgang

opbrengst

kennis

innovaties

jongeren

regio breed

## Stoplichtmonitor Regio Deal projecten 2020-2024

Regio Deal projecten	Begroting Startdatum	Rijksbijdrage Einddatum	Rapportages							Eindrapportage
			2 jul20-mei21	3 jul20-nov21	4 jul20-mei22	5 jul20-nov22	6 jul20-mei23	7 jul20-nov23		
<b>Project 1: Leefbaarheid in de dorpen</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■		
financiële voortgang	4.793.000	1.000.000	■	■	■	■	■	■		
looptijd en planning	1-10-2020	31-12-2024	■	■	■	■	■	■		
<b>Project 2: Transformatie centra steden</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■		
financiële voortgang	200.000	75.000	■	■	■	■	■	■		
looptijd en planning	1-7-2021 <sup>1</sup>	31-12-2024 <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■		
<b>Project 3: Voorzieningen voor internationale werknemers (AFGEROND)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■			doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	200.000	0	■	■	■	■			financiële realisatie	■
looptijd en planning	1-9-2020	31-03-2023 <sup>2</sup>	■	■	■	■			borging	■
<b>Project 4: Inzet data voor vitale voorzieningen (AFGEROND)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■			doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	60.000	0	■	■	■	■			financiële realisatie	■
looptijd en planning	1-9-2020	31-12-2022	■	■	■	■			borging	■
<b>Project 5: Voedseleducatie (VOORTIJDIG GESTOPT)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■		doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	450.000	150.000	■	■	■	■	■		financiële realisatie	■
looptijd en planning	1-9-2020	1-9-2023 <sup>3</sup>	■	■	■	■	■		borging	■
<b>Project 5b: Voedseleducatie: Smikkelen van eetbaar groen</b>										
inhoudelijke voortgang										
financiële voortgang	512.750	100.000								
looptijd en planning	2-1-2024	31-12-2024								

**Legenda**

- <sup>1</sup> Aangepaste startdatum
- <sup>2</sup> Aangepaste einddatum
- <sup>3</sup> Project is voortijdig gestopt
- <sup>4</sup> Gewijzigde systematiek codering financiële voortgang aangepast (vanaf rapportage 4) om beter inzicht te krijgen of een project middelen overhoudt (om te herbestemmen)

Regio Deal projecten	Begroting Startdatum	Rijksbijdrage Einddatum	Rapportages							Eindrapportage
			2 jul20-mei21	3 jul20-nov21	4 jul20-mei22	5 jul20-nov22	6 jul20-mei23	7 jul20-nov23		
<b>Project 6: Klaar voor de banen van nu en de toekomst</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■	■	
financiële voortgang	3.650.000	1.000.000	■	■	■	■	■	■	■	
looptijd en planning	10-7-2020	1-7-2024 <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	
<b>Project 7: SPARK Makers zone (AFGEROND)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■	doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	545.000	200.000	■	■	■	■	■	■	financiële realisatie	■
looptijd en planning	1-9-2020	30-9-2023	■	■	■	■	■	■	borging	■
<b>Project 8: Nieuwe perspectieven voor boeren (AFGEROND)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■	doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	180.000	130.000	■	■	■	■	■	■	financiële realisatie	■
looptijd en planning	1-9-2020	1-4-2023	■	■	■	■	■	■	borging	■
<b>Project 9: Puzzelen met ruimte in het buitengebied</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■		
financiële voortgang	4.250.000	1.650.000	■	■	■	■	■	■		
looptijd en planning	1-1-2021 <sup>1</sup>	31-12-2024 <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■		
<b>Project 10: Stallenaanpak - Vitalisering buitengebied: versterken omgevingskwaliteit en weerbaarheid</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■		
financiële voortgang	2.600.000	1.300.000	■	■	■	■	■	■		
looptijd en planning	1-9-2020	31-12-2024	■	■	■	■	■	■		
<b>Project 11: AgroProeftuin De Peel</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■		
financiële voortgang	3.040.000	1.000.000	■	■	■	■	■	■		
looptijd en planning	10-7-2020	31-12-2024	■	■	■	■	■	■		
<b>Project 12: AgriFood Innovation</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■		
financiële voortgang	11.770.000	1.350.000	■	■	■	■	■	■		
looptijd en planning	10-7-2020	31-12-2024 <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■		

**Legenda**

- <sup>1</sup> Aangepaste startdatum
- <sup>2</sup> Aangepaste einddatum
- <sup>3</sup> Project is voortijdig gestopt
- <sup>4</sup> Gewijzigde systematiek codering financiële voortgang aangepast (vanaf rapportage 4) om beter inzicht te krijgen of een project middelen overhoudt (om te herbestemmen)



Regio Deal projecten	Begroting Startdatum	Rijksbijdrage Einddatum	Rapportages							Eindrapportage
			2 jul20-mei21	3 jul20-nov21	4 jul20-mei22	5 jul20-nov22	6 jul20-mei23	7 jul20-nov23		
<b>Project 13: ODE (AFGEROND)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■			doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	400.000	100.000	■	■	■	■	■		financiële realisatie	■
looptijd en planning	1-10-2020	31-12-2022	■	■	■	■			borging	■
<b>Project 14: Circular Food Center</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■	■		
financiële voortgang	5.125.000	1.145.200	■	■	■	■	■	■		
looptijd en planning	1-10-2020	31-12-2024 <sup>2</sup>	■	■	■	■	■	■		
<b>Project 15: Greentech Park Brabant (AFGEROND)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■	■		doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	250.000	100.000	■	■	■	■	■		financiële realisatie	■
looptijd en planning	1-8-2020	1-10-2023 <sup>2</sup>	■	■	■	■	■		borging	■
<b>Project 16: Direct energie uit mest (AFGEROND)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■			doelstelling en resultaat	■
financiële voortgang	355.000	75.000	■	■	■	■	■		financiële realisatie	■
looptijd en planning	10-7-2020	31-03-2023 <sup>2</sup>	■	■	■	■	■		borging	■
<b>Project 16b: Algen als voedingsadditief</b>										
inhoudelijke voortgang										
financiële voortgang	64.130	64.130								
looptijd en planning	31-10-2023	31-12-2024								
<b>Project 17: Datagedreven Agrifoodregio (VOORTIJDIG GESTOPT)</b>										
inhoudelijke voortgang			■	■	■	■				
financiële voortgang	2.062.531	700.000	■	■	■	■	■			
looptijd en planning	1-7-2020	01-03-2023 <sup>3</sup>	■	■	■	■	■			
<b>Project 17b: Databehendig MKB</b>										
inhoudelijke voortgang										
financiële voortgang	226.245	142.980								
looptijd en planning	1-12-2023	31-12-2024								

**Legenda**

- <sup>1</sup> Aangepaste startdatum
- <sup>2</sup> Aangepaste einddatum
- <sup>3</sup> Project is voortijdig gestopt
- <sup>4</sup> Gewijzigde systematiek codering financiële voortgang aangepast (vanaf rapportage 4) om beter inzicht te krijgen of een project middelen overhoudt (om te herbestemmen)



*Botsproeven met de projectleiders van de Regio Deal (project 9. Puzzelen met ruimte)*

## 2 a: Inhoudelijke voortgang



## Inhoudelijke voortgang (1)

- Zeven projecten zijn afgerond.
- *3. Voorzieningen voor internationale werknemers:* pilot migratie-informatiepunt is gestart met monitoring regionaal kader in kopgroep Werkgelegenheid.
- *4. Inzet data voor vitale voorzieningen:* exchange portal wordt actief gebruikt door regiotaxi en gaat toegepast worden bij vraagstuk doelgroepwoningen en zorgtransformatie.
- *7. SPARK Makers zone:* andere middelen zijn aangeboord voor nieuwe TTO en vouchers voor ondernemers.



## Inhoudelijke voortgang (2)

- *8. Nieuw perspectieven voor boeren:* gemeente Meierijstad heeft methodiek toegepast op nieuwe groep boeren
- *13. ODE:* kennisdeling rondom duurzame dierlijke eiwitten wordt opgepakt met clusteraanpak van Circular Food Center
- *15. GreenTech Park Brabant:* gemeente Boxtel gaat methodiek breder toepassen
- *16. Direct energie uit mest:* agrarisch ondernemer gaat verder met toepassen algen



## Inhoudelijke voortgang (3)

Twee projecten 17a en 5a voortijdig beëindigd. Voor beide projecten is er een nieuwe invulling.

Drie nieuwe projecten eind 2023 gestart:

- 5b. Smikkelen van eetbaar groen door Jong leren eten, IVN Natuureducatie en stichting Spooky
- 16b. Algen als voedingsadditief door gemeente Oss i.s.m. DLV-advies
- 17b. Databehendig MKB door AgriFood Capital



## Inhoudelijke voortgang (4)

Overige 8 projecten zijn volop in uitvoering

- Voldoende enthousiasme en uitvoeringskracht om de projecten tot een goed einde te brengen.
  - *Project 9. Puzzelen met ruimte:* Veel wisselingen bij de provincie en tijdelijk geen capaciteit voor koppelteam.
  - *Project 14 CFC:* extra middelen toegekend voor internationale conferentie in juni en continueren en uitbouwen van de clusteraanpak in 2024
- 
- Begin 2024 financiële ruimte voor nieuwe projecten binnen pijler Anders Werken



## Inzette bewegingen door Regio Deal

- Samenwerking loont. Kennis over regionale samenwerking is vergroot.
- Maatschappelijk onbehagen creëert urgentie om extra te investeren op 'goed leven in alle facetten' en het betrekken van inwoners.
- Blijvende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om regionale oplossingen voor inwoners en bedrijven door inzet op ontwikkelmogelijkheden en perspectieven op werk
- Integrale gebiedsaanpak is noodzakelijk om invulling te geven aan de verschillende maatschappelijke opgaven en voorkomen verloedering landelijk gebied.
- Door stikstofvraagstuk en grondstoffencrisis staat bewustwording en transitie naar een duurzaam systeem van landbouw en voedselverwerking - precies, circulair, waardevol en verbonden - hoog op de agenda. Transitie van de landbouw is zeer complex en kost veel tijd.



*Eindgesprek met bestuurlijke trekker en projectleider (14. Circular Food Center: Duurzaam verpakken)*

## 2 b: Financiële voortgang





## Financiële voortgang (1)

- Eindafrekening
  - Begrotingen gerealiseerd door projecten 3, 4, 7, 8 en 15
  - Onderbenutting Rijksmiddelen door projecten 13 en 16
- Lopende projecten: uitbetalen voorschot
  - Een project *2. Transformatie centra middelgrote steden* ontvangt geen voorschot.
  - Alle andere projecten ontvangen afgesproken termijnbedrag.
- Verwachte realisatie begroting
  - Project 2 gaat de begroting zeker niet realiseren. Rijksmiddelen worden binnen de pijler Goed Leven herbestemd conform begroting 'overprogrammering'.
  - Project *12 AFI* gaat mogelijk de begroting niet realiseren. Dit wordt in Q1 2024 duidelijk.



## Financiële voortgang (2)

- Minimaal 50% publieke co-financiëring op de inzet van Rijksmiddelen is een voorwaarde van het Rijk. Dit is gerealiseerd.
- Provinciale bijdrage
  - In Q1 2024 valt besluit over een lening aan een leadpartner in project 12: AFI.
- Informatiebijeenkomst 18 december 2023 voor financieel adviseurs/penvoerders
  - SiSa, het financieel verantwoordingsinstrument richting Rijk, blijft een punt van aandacht. Ondanks instructies van de kassier, zijn niet alle SiSa's goed ingevuld. Alle projecten ontvangen mail op maat met instructies voor SiSa over 2023.
  - Samen met de provincie is een memo voor eindrapportage en -afrekening opgesteld voor de penvoerders en financieel adviseurs. De provincie gaat SiSa ook toepassen voor financiële eindverantwoording.




*Het jaarlijkse Rijk-Regio overleg met departementen en DB+ over de voortgang van de Regio Deal*

## 2 c: Looptijd en planning

# Looptijd

- 10 projecten tot eind 2024.
- *Project 6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst* gaat looptijd met half jaar verlengen tot juli 2024.

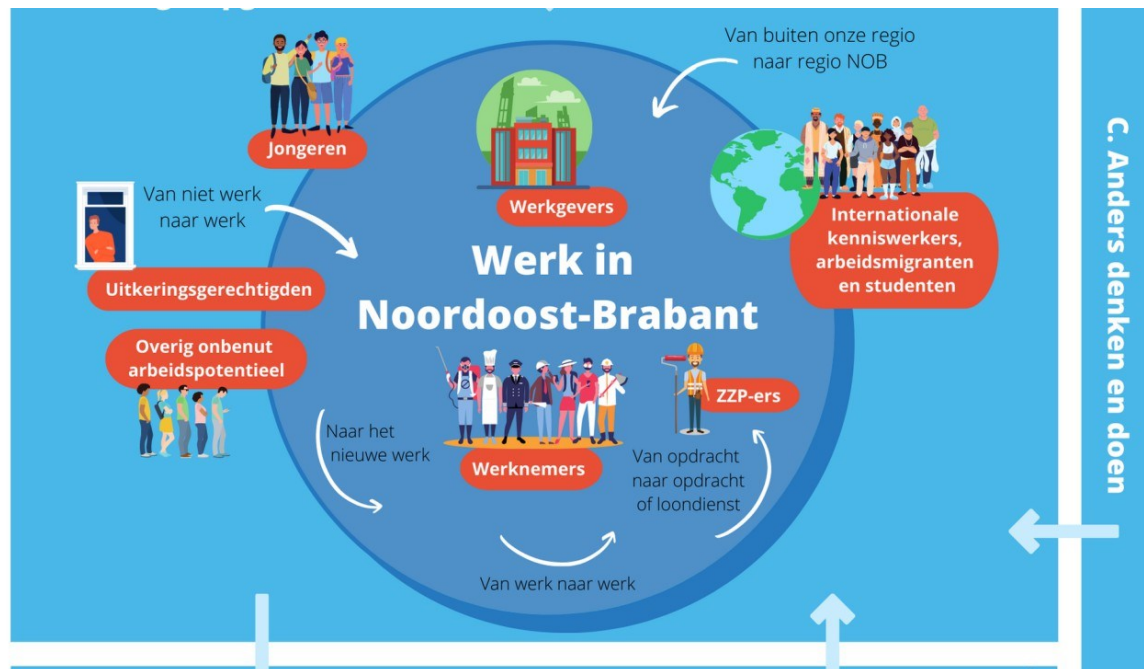



*Eindgesprek met bestuurlijke trekker, projectleider en penvoerder (3. Voorzieningen voor internationale werknemers)*

## 3: Brede Welvaart en effect



# CBS Monitor Brede Welvaart 2023: hier en nu

Thema	Indicator	Waarde			
		CBS Monitor 2020	CBS Monitor 2021	CBS Monitor 2022	CBS Monitor 2023
Welzijn	Tevreden met het leven	86,9%	84,8%	84,1%	83,7%
	Tevreden met vrije tijd	71,4%	75,8%	75,0%	72,8%
Materiële welvaart	Mediaan besteedbaar inkomen	€ 27.100	€ 27.300	€ 28.000	€ 31.400
	Bruto Binnenlands Product	€ 41.800	€ 42.100	€ 42,800	€ 45.300
Gezondheid	Overgewicht	48,6%	49,6%	49,6%	51,5%
	Levensverwachting bevolking	-	82 jaar	81,7 jaar	-
	Ervaren gezondheid	75,4%	79,2%	79,2%	71,7%
	Langdurige zieken	32,3%	31,6%	31,6%	32%
Arbeid en vrije tijd	Netto arbeidsparticipatie	70,8%	71,0%	72,7%	73,5%
	Bruto arbeidsparticipatie	73%	73,4%	75,1%	75,8%
	Hoogopgeleide bevolking	31,3%	32,9%	30,1%	30,7%
	Werkloosheid	2,9%	3,3%	3,2%	3%
	Vacaturegraad	Onbekend <sup>1</sup>	Onbekend <sup>1</sup>	Onbekend <sup>1</sup>	Onbekend <sup>1</sup>
	Tevredenheid reistijd wonen/werk	80,9%	83,5%	85,0%	-



Positie 1-10

Positie 11-20

Positie 21-30

Positie 31-40

<sup>1</sup> Het CBS levert op dit moment geen informatie over deze indicatoren. Dit wordt in de toekomst wel verwacht.



# CBS Monitor Brede Welvaart 2023: hier en nu (2)

Thema	Indicator	Waarde			
		CBS Monitor 2020	CBS Monitor 2021	CBS Monitor 2022	CBS Monitor 2023
Wonen	Tevreden met woonomgeving	87,7%	87,7%	87,7%	87,7%
	Tevreden met woning	87,3%	87,3%	88,0%	88,8%
	Afstand tot sportterrein	0,9 km	0,9 km	1,0 km	1,0 km
	Afstand tot basisschool	0,7 km	0,7 km	0,7 km	0,7 km
	Afstand tot café e.d.	1 km	1,1 km	1,1 km	1,1 km
Samenleving	Contact familie, vrienden of buren	73,5%	72,3%	72,0%	72,2%
	Vertrouwen in instituties	65,6%	71,6%	69,0%	62,7%
	Vertrouwen in anderen	60,9%	61,8%	64,7%	65%
	Vrijwilligerswerk	49,7%	47,1%	41,3%	45,7%
Veiligheid	4 indicatoren (zonder gegevens) <sup>1</sup>				
Milieu	Natuurgebied per 1000 inwoners	25	25 ha	25,0 ha	25,0 ha
	Emissies van fijnstof naar lucht	Onbekend <sup>1</sup>	Onbekend <sup>1</sup>	400 kg PM	400 kg PM
	Afstand tot openbaar groen	0,5 km	0,5 km	0,5 km	0,5 km
	Natuur en bosgebied	12%	12%	12,3%	12,3%
	Broeikasgasemissies	7,8 ton	9 ton	7,6 ton	7,6 ton
	Kwaliteit van zwemwater binnenwateren	-	-	-	4



Positie 1-10
Positie 11-20
Positie 21-30
Positie 31-40

<sup>1</sup> Het CBS levert op dit moment geen informatie over deze indicatoren. Dit wordt in de toekomst wel verwacht.



## Opvallende punten uit de CBS monitor 2023

- We doen het goed als regio (meer groen dan oranje/rood) vergeleken met de 39 andere regio's in Nederland.

### Negatieve ontwikkeling

- Daling van tevredenheid met leven en vrije tijd, ervaren gezondheid, vertrouwen in instituties
- Meer mensen met overgewicht en langdurige ziekten

### Positieve ontwikkeling

- Verbetering van materiele welvaart, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau beroepsbevolking, tevredenheid met woning, meer contacten met familie, meer vertrouwen in anderen en meer vrijwilligerswerk





*Bezoek aan programmateam Regio Deal Den Haag Zuid-West*

## 4. Publiciteit en communicatie



## Publiciteit en communicatie

### Door programmaorganisatie:

- Maandelijks update in nieuwsbrief RNOB
- Maandelijks minimaal één project uitgelicht in nieuwsbrief (van tellen naar vertellen)
- Bijeenkomsten projectleiders Regio Deal
- Voortgangsrapportage juli 2020 - mei 2023 is breed verspreid

### Door projecten:

- Eigen nieuwsbrieven/ website / LinkedIn/ Facebook
- Bijeenkomsten
- Nieuws- en persberichten



*Projectleidersbijeenkomst Regio Deal met enkele projectleiders van afrondende projecten*

## 5. Samenwerking



**Regio Deal**  
**Noordooost Brabant**

## Regio Deal Noordooost Brabant, dat doen we samen

Inwoners • werkgevers • werkgeversorganisaties • bewonerscollectieven • boeren • tuinders • hightech bedrijven • maakindustrie • basisscholen • horecabedrijven • supermarkten • horecaleveranciers • voedselverwerkende bedrijven • natuureducatiecentra • milieuorganisaties • agrarische collectieven • studenten • vervoersbedrijven • dataspecialisten • Platform Driven by Data • ICT-dienstverleners • advies- en onderzoeksinstellingen • voortgezet onderwijs • docenten • lectoren • ambassadeurs Keep on Learning • maatschappelijke organisaties • lokale en regionale samenwerkingsplatforms • ZLTO • Stichting Spoony • Jong Leren eten • IVN Natuureducatie • DLV-advies • verpakkingsbedrijven • SPARK Makers Zone • HAS green academy • TU/e • Wageningen UR • Avans Hogeschool • Jheronimus Academy of Data Science (JADS) • mbo onderwijs • praktijkonderwijs • werk- en ontwikkelbedrijven • vakbonden • Werkgeversservicepunt Noordooost-Brabant • Stichting Samen Tegen Voedselverspilling • FoodNL • ZET • gemeente Bernheze • gemeente Boekel • gemeente Boxtel • gemeente 's-Hertogenbosch • gemeente Heusden • gemeente Land van Cuijk • gemeente Maashorst • gemeente Meierijstad • gemeente Oss • gemeente Sint-Michielsgestel • gemeente Vught • waterschap Aa en Maas • waterschap De Dommel • RNOB • AgriFood Capital • Noordooost Brabant Werkt • OndernemersLift+ • provincie Noord-Brabant • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • Ministerie van Justitie en Veiligheid • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
