



Regio Deal Noorddoost Brabant

1^e Voortgangrapportage voor het DB+

21 januari 2021



Rijksoverheid

Provincie Noord-Brabant

Regio
Noorddoost
Brabant

AgriFood
Capital

Noorddoost
Brabant **Werkt**

Inhoudsopgave

0. Status / woord vooraf
1. Algemeen: de Regio Deal in een notendop
2. Stand van zaken: voortgang per pijler en project
3. Financiën: voortgang en veel voorkomende vragen en misverstanden
4. Stand van zaken programma-organisatie
5. Communicatie
6. Samenwerking Rijk – Regio
7. Samenwerking in de regio
8. Monitoring op effecten
9. Beslis- en aandachtspunten

Status / woord vooraf:

- Dit betreft de 1^e voortgangsrapportage voor de Regio Deal
- Projecten bevinden zich veelal nog in de voorbereidingsfase
- Er is daarom nog weinig te melden over de financiële voortgang; dat zal een volgende keer meer aandacht krijgen
- De peildatum was oorspronkelijk 1 november 2020
- N.a.v. bespreking van de concept voortgangsrapportage zijn tussentijds enkele knelpunten opgelost en ook zijn er in de tussentijd nog andere ontwikkelingen geweest (bv. rondom afgifte van beschikkingen), zodat deze rapportage geactualiseerd is op die ontwikkelingen (en nu de stand van zaken per 1/1/2021 weergeeft).
- Het nut van de voortgangsrapportage heeft zich in die zin al bewezen omdat tijdens het maken ervan knelpunten zijn opgelost; hoewel er geen zware beslispunten meer over zijn verzoeken we u kennis te nemen van deze voortgang, uw reactie te geven op de conclusies en eventuele tips te geven voor het vervolg!

Nu aan de slag

Voor goed leven, fijn wonen en anders werken in Noordoost Brabant!

ECONOMISCH STERKE REGIO



Bevolking **650** duizend inwoners
Bruto Regionaal Product **27** miljard euro
Werkgelegenheid **330** duizend banen



'Van boer tot bord'
Agrifood als economisch stuwende factor



Stuwende economische kracht zwaar onder druk

Initiatiefnemers:
Regio Noordoost Brabant samen met Provincie Noord-Brabant, Stichting AgriFood Capital, Stichting OndernemersLift+ en Noordoost Brabant Werkt

EEN REGIODEAL MET HET RIJK MOET ZORGEN VOOR:

- Versnelling
- Intensivering en/of uitrol van projecten
- Partnerschappen met het Rijk

Past in uitvoering strategische agenda's van de regio.



AANPAK



ER IS NÚ STURING EN ONDERSTEUNING NODIG!

LEVEN

- Voorzieningen verdwijnen
- Jongeren trekken weg



WONEN

- Leefomgeving onder druk door transitie en sanering veehouderij



Landbouw:
- Traditioneel werk onder druk en agro-industrie in transitie

50% boeren stopt
300.000 m² aan stallen komt vrij in landelijk gebied t/m 2022



Robotisering en dataficatie leiden tot een uitstoot van mensen en vragen om anders werken



GOED LEVEN

Verbetering blijfklimaat

- Platteland: Meer eigen initiatief, sturing en participatie van bewoners in verbeteren leefbaarheid (in kernen op platteland), beweging op gang brengen.
- Stad: Voorzieningen op peil houden door aantrekkelijke centra en voorzieningen in de middelgrote steden zodat bewoners blijven wonen in de regio en de centra aantrekkelijk blijven voor werknemers van bedrijven.



FIJN WONEN

Slim inrichten van de leefomgeving

- Mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen en van de noodzakelijke transitie in het landelijk gebied, zonder dat deze elkaar gaan bijten, zoeken naar winwin en fors reduceren hinder door schadelijke uitstoot: gebiedsregie door overheden!
- Voorkomen verloedering landelijk gebied, voorkomen criminaliteit en ondermijning, mogelijk maken herinrichting voor andere (groene) functies.



ANDERS WERKEN

Banen en talenten voor de toekomst

- Realiseren open innovatie waarmee AgriFoodsector transformeert naar een sector die precies, waardevol, verbonden en circulair is.
- Bedrijven en werknemers zijn voorbereid op werk van de toekomst. MKB heeft toegang tot experimenteeromgevingen; specifieke doelgroepen krijgen een betere toegang op arbeidsmarkt.




1. Algemeen: Samenhang tussen de pijlers

Sleutelprojecten

Leefbaarheid in de dorpen
Aanpak stallen en weerbaarheid
buitengebied
AgroProeftuin De Peel
AgriFoodInnovation
Circular Food Center
Datagedreven AgriFoodregio

Ondersteuningsprojecten

Nieuwe perspectieven voor boeren
Voedseleducatie
Direct energie uit mest



Kansrijke projecten

Ontwikkel- en duurzaamheidscentrum
voor Duurzame Eiwitten (ODE)
GreenTech Park Brabant

Verbindingsprojecten

Transformatie centra steden
Klaar voor de banen van nu en de toekomst
SPARK Makers zone
Puzzelen met ruimte in het buitengebied

Kielzogprojecten

Inzet data voor vitale voorzieningen
Voorzieningen voor arbeidsmigranten




2. Stand van zaken - voortgang

Goed Leven
1. Leefbaarheid in de dorpen
2. Transformatie centra steden
3. Voorzieningen voor arbeidsmigranten
4. Inzet data voor vitale voorzieningen
5. Voedseleducatie
6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst
7. SPARK Makers Zone
8. Nieuwe perspectieven voor boeren
Fijn wonen
9. Puzzelen met ruimte in het buitengebied
10. Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied
11. AgroProeftuin De Peel
Anders Werken
12. AgriFoodInnovation
13. Ontwikkel- en Expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE)
14. Circular Food Center
15. GreenTech Park Brabant
16. Direct energie uit mest
17. Datagedreven Agrifoodregio

Status
Project in uitvoering
Projectorganisatie is opgestart
Vorbereidende fase
Project in uitvoering
Projectorganisatie is opgestart
Project in uitvoering
Projectorganisatie is opgestart
Project in uitvoering
Projectorganisatie is opgestart

Status
Projectorganisatie is opgestart
Projectorganisatie is opgestart
Project in uitvoering

Status
Projectorganisatie is opgestart
Projectorganisatie is opgestart
Project in uitvoering
Projectorganisatie is opgestart
Projectorganisatie is opgestart
Projectorganisatie is opgestart

Legenda	
	Project in uitvoering
	Projectorganisatie is opgestart
	Vorbereidende fase
	Knelpunt

Peildatum 1 december



Pijler 1: Goed leven

Projectnaam:	Bestuurlijke opdrachtgever(s):	Projectleider:
1. Leefbaarheid in de dorpen	M.Jilisen (Cuijk) W. Bollen (St Anthonis) B. de Bruin-Van Vugt (Boxmeer)	G. Roelofs (Cuijk)
2. Transformatie centra steden	M. Jilisen (Cuijk)	R. Rongen (Cuijk)
3. Voorzieningen van arbeidsmigranten	J. Goijaarts (Meierijstad) W. Bollen (St. Anthonis) R. van Moorselaar (Bernheze) K. van Geffen (Oss)	G. Olthof (extern)
4. Inzet data voor vitale voorzieningen	F. van Lankvelt (Uden)	J. van der Hoek & L. IJsseldijk (Uden)
5. Voedseleducatie	K. van Rooij (Meierijstad)	R. Verpoort (Meierijstad/RNOB)
6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst	K. van Geffen (Oss)	Nog in te vullen
7. Spark Makers zone	J. Hoskam ('s-Hertogenbosch)	C. Vugts (SPARK)
8. Nieuwe perspectieven voor boeren	F. den Brok (Oss)	A. Crommentuijn (OL+)

Opmerkingen
Alle rollen ingevuld / project gestart. Externen al betrokken en goede startbijeenkomst gehouden.
Gaat in 2021 echt van start (planning is bijgesteld / geen knelpunt).
N.a.v. het Directeurenoverleg : de gemeente Meierijstad zal het formele opdrachtgeverschap op zich nemen. Daarmee kan de beschikking verstrekt worden.
Project gestart met voorverkenning techniek. Rollen ingevuld.
N.a.v. het Directeurenoverleg: de gemeente Meierijstad zal het formele opdrachtgeverschap op zich nemen. Daarmee kan de beschikking worden verstrekt.
Loopt goed. Looptijd en doelen volledig afgestemd op provinciaal programma arbeidsmarkt / projectleidster vanaf 1/1/21 programmamanager.
Loopt goed
Vorbereiding project loopt; er was onduidelijkheid over bijdrage vanuit provincie (in kind bijdrage projectleider). Is inmiddels opgelost.



Pijler 2: Fijn Wonen

Projectnaam:	Bestuurlijke opdrachtgever(s):	Projectleider:
9. Puzzelen met ruimte in het buitengebied (integrale gebiedsprocessen)	L. Verheijen (Waterschap Aa en Maas)	J. Goris (kwartiermaker) Waterschap Aa en Maas neemt dit over.
10. Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied (ondermijning)	W. Bollen (Sint Anthonis) M. Buijsse (Boekel) J. Goijaarts (Meierijstad)	M. Beurskens (St Anthonis) draagt het binnenkort over. Weerbaarheid: A. Vos (Meierijstad)/ J. van den Broek (RIEC)
11. AgroProeftuin De Peel	Consortium van HAS, WUR, ZLTO, Ondernemer, AgriFood Capital en RNOB: vertegenwoordigd door B. Brands (Landerd) en W. Bollen (St. Anthonis)	M. Ytsma en C. van Soest (AgriFood Capital)

Opmerkingen
Zit nog in voorbereidende fase / Overdracht kwartiermaker naar projectleider in december 2020 (Sara de Boer / Marlies Kampschreur).
Ambtelijke projectleider (opdrachtgever voor externe projectleider) krijgt nieuwe functie en was nog niet volledig opgestart. Er wordt gezocht naar nieuwe projectleider + financiële ondersteuning bij één van de betrokken gemeenten. Externe projectleider wel gestart, maar wacht op formele opdracht. N.a.v. het Directeurenoverleg: afgesproken is dat de gemeente Meierijstad de formele rol behorend bij het financiële beheer op zich gaat nemen en dat daarmee de beschikking kan worden verstrekt.
Project loopt voorspoedig. Al externe bijeenkomst gepland.



Pijler 3: Anders Werken

Projectnaam:	Bestuurlijke opdrachtgever(s):	Projectleider:
12. AgriFoodInnovation	Consortium WUR, TUE, ZLTO, HAS en Provincie Noord Brabant K. van Rooij (Meierijstad) is bestuurlijke aanspreekpunt	Ton Hagelstein (AgriFood Capital)
13. Ontwikkel en Expertise Centrum Eiwit (ODE)	Consortium WUR, TUE, HAS, Provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital en F. den Brok (Oss)	A. van der Sanden (AgriFood Capital)
14. Circular Food Center	F. den Brok (Oss) J. Goijaarts (Meierijstad)	C. Hagenstein (Oss) en T. Timmermans (Stichting tegen voedselverspilling)
15. GreenTechPark Brabant	M. Lestrade (Boxtel)	F. Koesen (Boxtel)
16. Direct energie uit mest	J. van der Schoot (Oss)	M. Franken (Oss) / G.J. Roefs (extern)
17. Datagedreven Agrifoodregio	J. Hoskam ('s-Hertogenbosch)	M. Lambregts (Stichting Driven by Data)

Opmerkingen
Projectuitvoering in voorbereiding. Oplossing voor de toegezegde revolverende bijdrage is gevonden, doordat provincie zelf zorgdraagt voor toekenning van deze bijdragen aan innoverende bedrijven en bewaakt dat terugvloeiende middelen opnieuw in de regio Noordooost-Brabant en aan hetzelfde doel worden besteed.
Projectleider is gestart; haalbaarheidsstudie in voorbereiding.
Project bestaat uit 2 delen die gecoördineerd worden opgepakt: 1 deel gericht op verpakkingen (trekker Oss) en 1 deel gericht op voedselverspillingen (trekker Stichting). Beide onderdelen al voortvarend van start gegaan. Aanvraag provinciale bijdrage heeft veel tijd gekost maar lijkt nu rond. Aandachtspunt is wie de beschikking gaat ontvangen en de overall coördinatie op zich neemt.
Project gestart. Naar aanleiding van eerdere brief vanuit de gemeente met bezwaren over de procedure zijn die uitgepraat en opgelost. Als gevolg van verkiezingen zal rol Bestuurlijk opdrachtgever veranderen.
Project gestart.
Project gestart. Projectplan en begroting is enigszins aangepast i.v.m. risico's bij EU financiering van andere onderdelen.

Algemene opmerkingen n.a.v. voortgangsgesprekken

- Enkele projectleiders vragen om jaarkalender i.v.m. planning met o.a.:
 - Deadlines voor rapportages
 - Planning van webinars, werkbezoeken etc.
 - Onduidelijkheid over financiën en verantwoordingseisen: is goed opgepakt door de kassier en programma-organisatie door extra webinar hierover (met ook financieel adviseurs).
 - Gebleken is dat er rondom "staatssteun" een potentieel risico zit bij de bepaling vanuit de Regio Deal dat EU bijdragen mogen meetellen als regionale bijdrage; omgekeerd liggen hier risico's (omdat Europa strenge regels kent dat eenmaal gegeven subsidies (in dit geval vanuit het rijk) niet mag meetellen.
 - Jammer dat het niet gelukt is via 1 loket subsidies aan te vragen.
 - Blij met toezegging dat voortgangsmelding en verantwoording wel via 1 lijn gaat!
- Actie: Jaarkalender wordt begin 2021 gemaakt !
- Opgelost ✓
- Opgelost ✓
- Actie: Voortgangsbewaking en verantwoording in één lijn organiseren !

Algemene opmerkingen n.a.v. voortgangsgesprekken

- Provinciale subsidie aanvraag leidde in enkele gevallen tot extra werklust:
 - aanvullende eisen over begrotingsopstelling , vragen die in voortraject al gesteld waren en BIBOB is lastige procedure die veel tijd vraagt.
 - Problemen - mede door adequaat ingrijpen van Richard Dumont en Monique Bakker – nu opgelost.
 - Leerpunt: eerder opschalen en hulp vragen (projectleiders bij programmamanager of kassier; provinciale medewerkers bij de provinciale coördinator.
- Faciliteren van onderlinge contacten (incl. relatie Rijk) wordt gewaardeerd:
 - doel: inhoudelijk van elkaars projecten leren en intervisie.
 - verzoek om begin 2021 opnieuw bijeenkomsten met projectleiders te organiseren.

Leerpunt 

Actie: Organiseren van vervolgbijeenkomsten voor projectleiders in 2021 !




3. Financiën: gezamenlijke impuls van € 40 mln.

Totaalpakket Regio Deal:

- € 10 mln. van het Rijk
- Ca. € 10 mln. van de provincie
- Ca. €10 mln. cofinanciering van: Gemeenten en waterschappen
- Ca. € 10 mln. overige bijdragen: Bedrijven en kennisinstellingen (deels 'in kind')

Hefboomeffect is groot!

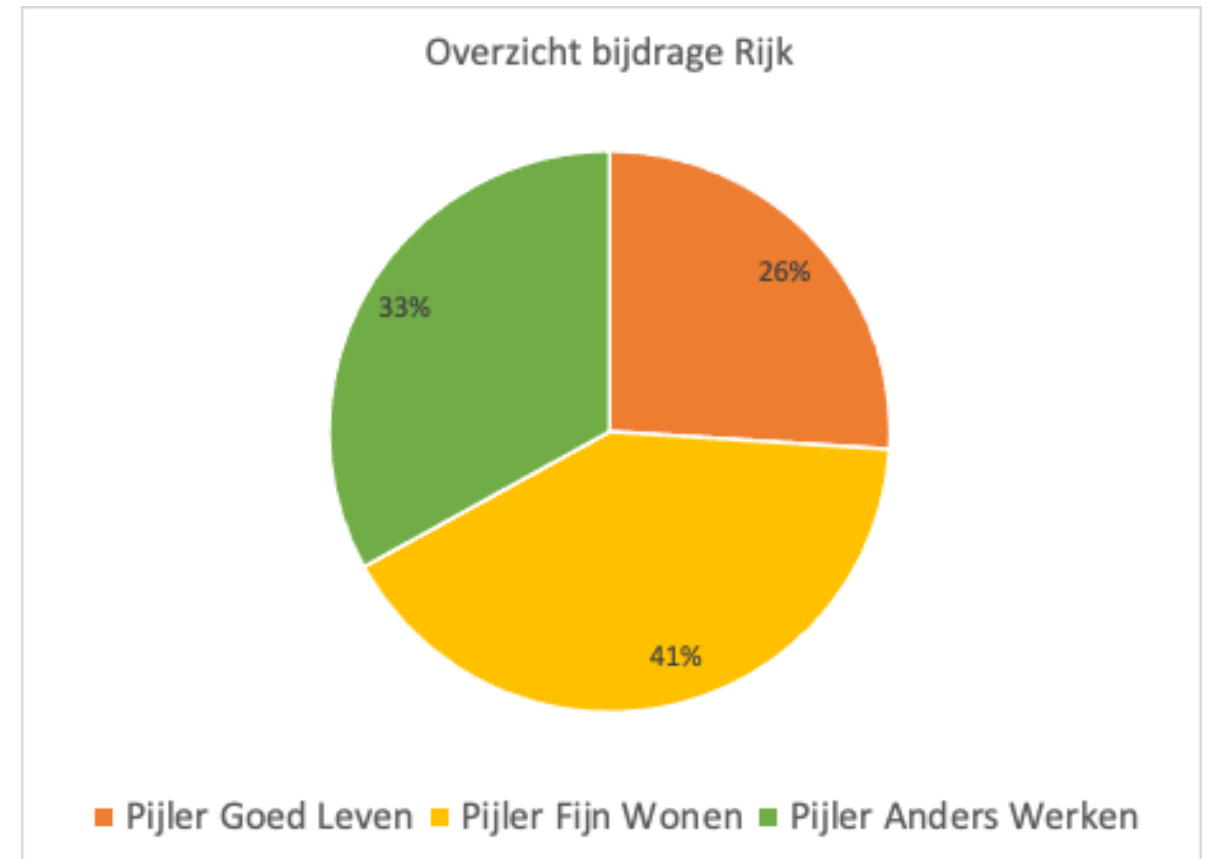

Voortgang aanvraag beschikkingen door kassier

Goed Leven	Status	Legenda
1. Leefbaarheid in de dorpen		Beschikking klaar en verzonden
2. Transformatie centra steden		Alles ontvangen. Beschikking wordt in januari 2021 verzonden
3. Voorzieningen voor arbeidsmigranten		Uitstel. Beschikking in januari 2021 verzonden na ontvangst 0-meting
4. Inzet data voor vitale voorzieningen		
5. Voedseleductie		
6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst		
7. SPARK Makers Zone		
8. Nieuwe perspectieven voor boeren		
Fijn wonen	Status	
9. Puzzelen met ruimte in het buitengebied		
10. Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied		
11. AgroProeftuin De Peel		
Anders Werken	Status	
12. AgriFoodInnovation		
13. Ontwikkel- en Expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE)		
14. Circular Food Center		
15. GreenTech Park Brabant		
16. Direct energie uit mest		
17. Datagedreven Agrifoodregio		

Opmerking

Op project 6 "klaar voor banen van nu en de toekomst" na betalen wij de eerste termijn van de rijksbijdrage eind december 2020 uit.

Aanvraag hiervoor is in goede orde ontvangen

Financiën: Bevoorschotting en provinciale beschikkingen

- We hebben van het Rijk een voorschot eerste tranche ontvangen voor een bedrag 4,7 miljoen euro. Hiermee kunnen we het eerste termijn van de 0-metingen die we tot nu toe hebben ontvangen in 2021 betalen.
- Op 18 december 2020 hebben we een eerste betaling voor de bevoorschotting uitgevoerd voor een bedrag van 1,3 miljoen euro.
- Van het Rijk ontvangen we de tweede tranche voor 31-12-2021.
- De provincie heeft op basis van de binnengekomen aanvragen inmiddels voor 4 projecten de beschikking afgegeven.

Voortgang aanvraag beschikkingen door provincie

Goed Leven
1. Leefbaarheid in de dorpen
2. Transformatie centra steden
3. Voorzieningen voor arbeidsmigranten
4. Inzet data voor vitale voorzieningen
5. Voedseleducatie
6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst
7. SPARK Makers Zone
8. Nieuwe perspectieven voor boeren

Status
Green
Blue
Blue
White
Blue
Green
Green
White

Legenda	
Green	Beschikt in 2020
Blue	Beschikking volgt in eerste kwartaal 2021
Yellow	Na ontvangst van de aanvraag kan de beschikking in het eerste kwartaal van 2021 worden verstuurd
Grey	Nog in overleg over beschikking
White	Niet van toepassing

Fijn wonen
9. Puzzelen met ruimte in het buitengebied
10. Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied
11. AgroProeftuin De Peel

Status
Blue
White
Grey

Anders Werken
12. AgriFoodInnovation
13. Ontwikkel- en Expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE)
14. Circular Food Center
15. GreenTech Park Brabant
16. Direct energie uit mest
17. Datagedreven Agrifoodregio

Status
Blue
Blue
Blue
Blue
Yellow
Yellow



Financiën: Veel voorkomende vragen

- Loonkosten: wat is subsidiabel?
 - De kosten van personen die tijdelijk of specifiek worden ingehuurd voor uitvoering van het project van de Regio Deal zijn subsidiabel;
 - De kosten personeel in loondienst, niet zijnde ambtenaren zoals beschreven onder artikel 8.3, voor uitvoering van het project van de Regio Deal zijn subsidiabel.
- BTW: alle bedragen zijn bruto-bedragen (en dus bedragen inclusief BTW). Partijen die BTW kunnen compenseren krijgen op voorhand minder geld en moeten de BTW later terug halen uit het BTW Compensatiefonds.
- Wie kan de subsidie aanvragen? Alleen organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen subsidie aanvraag doen; bij projecten die vanuit de regio zelf worden gedaan is gedelegeerd eigenaarschap nodig van een van de overheden.
- Jaarlijks moet een SISA-bijlage over het boekjaar ingediend worden als bijlage bij de jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring, zoals opgenomen in artikel 14-1a-II van de subsidieregeling Regio Deal Noordoost Brabant.


4. Stand van zaken programma-organisatie

- Governance blijft zoals bij voorbereiding Regio Deal: Programmteam / Directeurenoverleg / DB+
 - Gemeentelijke vertegenwoordigster (Marijke Wilms) en vertegenwoordiger Kassiersfunctie (Edwin Dovern) toegevoegd aan Directeurenoverleg
 - Kassier en communicatieadviseur nu ook lid van programmteam
- Programma-organisatie en administratieve organisatie gereed
 - Nieuwe programmamanager (uit de regio zelf) gevonden: Karin van Meer start op 1/1/2021
 - Vacature programmasecretaris nog niet ingevuld
 - Kassiersfunctie gemeente 's-Hertogenbosch ingericht en gestart
 - Subsidieregeling door DB+ en college van B&W 's-Hertogenbosch vastgesteld
 - Voortgangsbewakingssysteem ingericht (2 x per jaar)
- 10 september: energieke startbijeenkomst met projectleiders, provincie **en Rijk** geweest
 - Nadruk op verbindingen leggen en van elkaar leren in de aanpak
 - Startbijeenkomst in beeld <https://youtu.be/OrF6ebP-i7s>
- Verbinding met Portefeuillehoudersoverleggen van de Regio gelegd



5. Communicatie

- Vanuit enkele projecten al mooie bijeenkomsten gehouden:
 - Startbijeenkomst “leefbaarheid in de dorpen” met bestuurders en ‘streekholders’
 - Vanuit Spark, Circular Food Center en AgroProeftuin De Peel
 - Belangstelling Staatssecretaris SZW voor NOBW / Arbeidsmarktprogramma’s
- Colleges, Raden, AB- en DB Waterschappen geïnformeerd:
 - Direct na bekendmaking deal 13 juli
 - Nieuwsbrief in september 2020 en via Social media
- Per pijler webinars met de bestuurlijke trekkers + projectleiders + belangstellenden georganiseerd:
 - Op 27/11: geopend door Jack Mikkers (namens de Regio)
 - Op 4/12: met Michel Berkelmans van LNV (namens het Rijk)
 - Op 11/12: met Elies Lemkes (namens de Provincie)
- Regionale raadsinformatiebijeenkomst gericht op informeren gepland op 1 februari 2021
- Communicatieplan en toolkit beschikbaar:
 - Eigen logo’s en huisstijl
 - Nadruk op sociale media
 - Eigenaarschap bij projecten zelf
- Actief binnen Rijksprogramma rondom Regio Deals / communicatie



6. Samenwerking Rijk – Regio: Algemeen

- Aantal projecten heeft al contact met het Rijk:
 - Veelal uitbouw van bestaande contacten, zoals bij arbeidsmarktregio, AgriFoodInnovation en De Peel.
- Overleg Rijk – Regio werkt positief:
 - Jack Mikkers heeft op 17/12 eerste overleg gehad over relatie weerbaarheid (Regio Deal) en handhaving rondom ondermijning; vervolg wordt samen met RIEC opgepakt.
 - Vanuit het Rijk wordt aangegeven (met namen/rugnummers) wie contactpersoon is voor welk project bij het Rijk.
 - Voor Circulaire Economie wordt op korte termijn een vervolgoverleg ingepland.
- Spin off: BZK tipte over kansen voor bijdragen aan huisvesting voor arbeidsmigranten! 6 gemeentelijke voorstellen uit Regio NOB gehonoreerd! Hierdoor is aanvullend € 2,2 mln. aan steun verkregen naast de Regio Deal.
- Enige terughoudendheid bij enkele projectleiders. Vanuit voortgangsgesprek is mindset aan het veranderen: vroegtijdig betrekken zorgt voor echte partnerschap.
 - Vanaf januari tafelgesprekken inplannen (samenhangende projecten met betrokken departementen).
 - Sommige projecten zullen rijksvertegenwoordiger in begeleidingsgroep vragen.

Samenwerking Rijk – Regio: per project

Goed leven	Wanneer	Contacten met departementen
1. Leefbaarheid in de dorpen	Q4/20	Zijn gelegd: BZK + LNV (+ Ver. Van Kleine Kernen)
2. Transformatie centra steden	Q2/21	Wil graag in contact met EZK + BZK + JenV
3. Voorzieningen voor arbeidsmigranten	Q4/20	Contact gelegd in relatie tot Roemer (BZK / SZW)
4. Inzet data voor vitale voorzieningen	PM	Nog niet zover
5. Voedseleductie	Q1/21	Wil samen met FoodNL met LNV + OCW contact
6. Klaar voor de banen van nu en de toekomst	Q4/20	Regulier contact (SZW + OCW) + werkbezoek Stas. SZW
7. SPARK Makers Zone	Q1/21	Staat open voor contact (o.a. EZK) en werkbezoeken
8. Nieuwe perspectieven voor boeren	Q2/21	Staat open voor contact met LNV
Fijn Wonen	Wanneer	Contacten met departementen
9. Puzzelen met ruimte in het buitengebied	Q4/20	Heeft contact met LNV / nog verbreden met BZK, IenW, BZK
10. Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied	Q4/20	Contact met JenV gelegd (via RIEC), in december overleg Regio met JenV, EZK en LNV.
11. AgroProeftuin De Peel	Q3/20	Heeft regulier contact met BZK en LNV (ook i.v.m. IBP)
Anders Werken	Wanneer	Contacten met departementen
12. AgriFoodInnovation	Q1/21	Heeft al regulier contact vanuit AFC met LNV. Over AFI doorpraten is gewenst
13. ODE	Q1/21	Kan gecombineerd worden met 12.
14. Circular Food Center	Q1/21	Wil graag in overleg met IenW en EZK. Al in contact met LNV.
15. GreenTech Park Brabant	PM	Staat open voor gesprek. Vermoedelijk met LNV en BZK (Biobased Economy).
16. Direct energie uit mest	Q2/21	Staat open voor contact met LNV.
17. Datagedreven Agrifoodregio	Q1/21	Staat open voor gesprek met EZK en LNV.

7. Samenwerking binnen de regio versterkt

- De Regio Deal heeft niet alleen gezorgd voor meer verbinding tussen de regio en het Rijk, maar ook als positief effect gehad dat er binnen de regio zelf veel meer wordt samengewerkt tussen gemeenten onderling en met triple helix partijen:
 - Elk project heeft inmiddels een bestuurlijke trekker vanuit de Regio (er is eigenaarschap).
 - O.a. via Leefbare dorpen, voorzieningen voor arbeidsmigranten, aanpak stallen en weerbaarheid in buitengebied.
- Ook is de samenwerking tussen provincie en de regio geïntensiveerd:
 - De provincie participeert in een aantal projecten, zoals puzzelen met ruimte, voorzieningen voor arbeidsmigranten, de aanpak stallen en weerbaarheid in het buitengebied en bij tal van innovatieve projecten uit de 3^e pijler.
 - De provincie is vaste deelnemer geworden van het DB+ van de regio en van het Directeurenoverleg.
 - Werkbezoeken van nieuwe gedeputeerden aan de regio gekoppeld aan projecten uit de Regio Deal.
 - Ook op andere onderdelen vinden de partijen elkaar nu beter, zoals rond de indiening van het programma Foodswitch voor het nationaal Groeifonds.



Regio Deal Noordooost Brabant

Regio
Noordooost
Brabant

AgriFood
Capital

Noordooost
Brabant **Werkt**

Provincie Noord-Brabant



Conclusie: de onderlinge
samenwerking is echt
versterkt!



8. Monitoring op effecten

Naast voortgangsbewaking ook monitoring van effecten: 0-meting in voorbereiding



Regio Deal-projecten zijn onderdeel van samenwerkingsagenda's en uitvoeringsprogramma's! Monitoring combineren met impactmeting van de uitvoering.

Aanpak monitoring op effecten

Uitgangspunten:

- Monitoring per pijler – Goed leven, Fijn Wonen, Anders werken
- Output vertalen in outcome indicatoren
- Doel: "meten is leren" / Focus: op effect!
- Aansluiten op bestaande bronnen en data (o.a. PBL, Provinciale data)
- Tevens input vanuit de projecten
 - Leefbaarheidsmonitor
 - Bewonerspanels

Proces:

1. Leren van andere Regio's, o.a. via voorbeelden en webinar 24/11 (november)
2. Input opgehaald uit de projecten via gespreksronde (november)
3. Opstellen plan van aanpak (december/januari), met daarin opzet 0-meting
4. Uitvoeren 0-meting (eerste kwartaal 2021)

9. Conclusies

Kan het DB+ zich vinden in de volgende constatering:

1. Het programma Regio Deal verloopt in grote lijnen volgens planning.
 - Vrijwel alle projecten zijn in voorbereiding genomen en sommige zelfs al in uitvoering.
 - Transformatie centra steden wordt in januari opgestart en vormt geen knelpunt.
 - Er is geen reden om op dit moment al tot bijstellingen in de programma-begroting te komen.
 - De programma-organisatie staat goed.
 - Het getraptd voorbereiden en bespreken van de voortgangsrapportage heeft een stimulerend effect op de voortgang en zorgt ervoor dat tussentijdse knelpunten versneld opgelost worden.
2. De aangevraagde voorschotten passen binnen de randvoorwaarden en zijn inmiddels verstrekt.
3. Gelet op de voortgang zal het Rijk gevraagd worden om in principe medio 2021, bij de indiening van de 2^e voortgangsrapportage, ook de 2^e tranche aan voorschotten over te maken.
4. Aan de verbeter- en actiepunten zal door het programmamanagement actief invulling worden gegeven in de komende periode (zoals het maken van een jaarplanning, het plannen van overleggen met het Rijk etc.)
5. Het is belangrijk om naast de voortgangsbewaking oog te houden voor nieuwe kansen die zich voordoen door de geïntensiveerde samenwerking tussen Rijk, provincie en regio.
